

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-005


主送: 河北舒阳新能源科技有限公司 (施工单位)

抄送: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 (建设单位)

主题: 关于防雷接地的相关事宜

内容: 监理工程师在大屯镇施工现场巡查时发现, 防雷接地扁钢与接地极焊接质量不符合规范要求, 使用的防雷接地材料不符合设计图纸的要求。(详见附件)

要求施工单位严格按照设计图纸进行材料的采购, 所有材料必须经过监理项目部验收合格后方可使用, 防雷接地焊接严格按照 GB50601-2010 规范要求执行, 特殊工种必须持证上岗, 否则产生一切返工全部由施工单位承担。

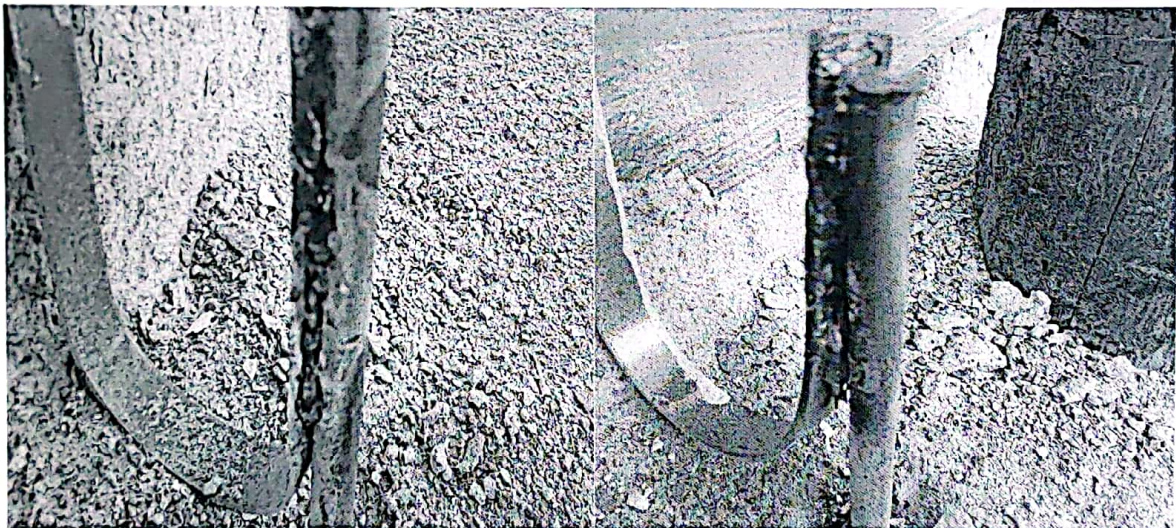

2. 本工程组件支架钢架进行接地, 屋面钢架导轨已形成整体连接, 在其四周便于引下的位置采用圆钢 $\phi 12$ 作为引下线引至地面, 引下线不少于2根。在地面空地位置设置独立接地极, 接地极采用镀锌角钢 L50x50x5, 长度2.5米。接地极间距不宜小于5米, 接地线埋深不低于0.8米(且位于冻土层下)。

项目监理机构 (章):

总监理工程师: 任永生

日期: 2022年01月04日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建
