

监 理 联 系 单

工程名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司 200KWp 分布式光伏发电（江苏盈科）项目

编号：ZHJL-JSYK-LXD-004

致：四川垚州建设工程有限公司施工项目部

事由：关于施工现场电缆敷设相关问题

内容：贵单位承揽施工的《瑞能光伏科技（句容）有限公司 200KWp 分布式光伏发电（江苏盈科）项目》：

目前正在敷设交流电缆，存在以下几点问题：

- 1、 电缆下墙处镀锌钢管管口未处理，毛刺较多，电缆表面有划伤现象，且该位置电缆敷设时转角未满足电缆最小转弯半径。
- 2、 下墙桥架至厂房飞檐处为连续直角转弯，该处电缆敷设必须满足规范要求的转弯半径。
- 3、 关于电缆沟因厂区地下埋有缆线无法达到要求事项，目前收到建设单位指示，要求先将镀锌钢管连接放置电缆沟内，确定好现场情况后方可施工（管道要求焊接，焊接前做好管口处理，做成喇叭口或者清理管口毛刺，焊接后做好防腐处理，转角需增加弯头）


抄送：瑞能光伏科技（句容）有限公司

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：王云东

日期：2022年01月21日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

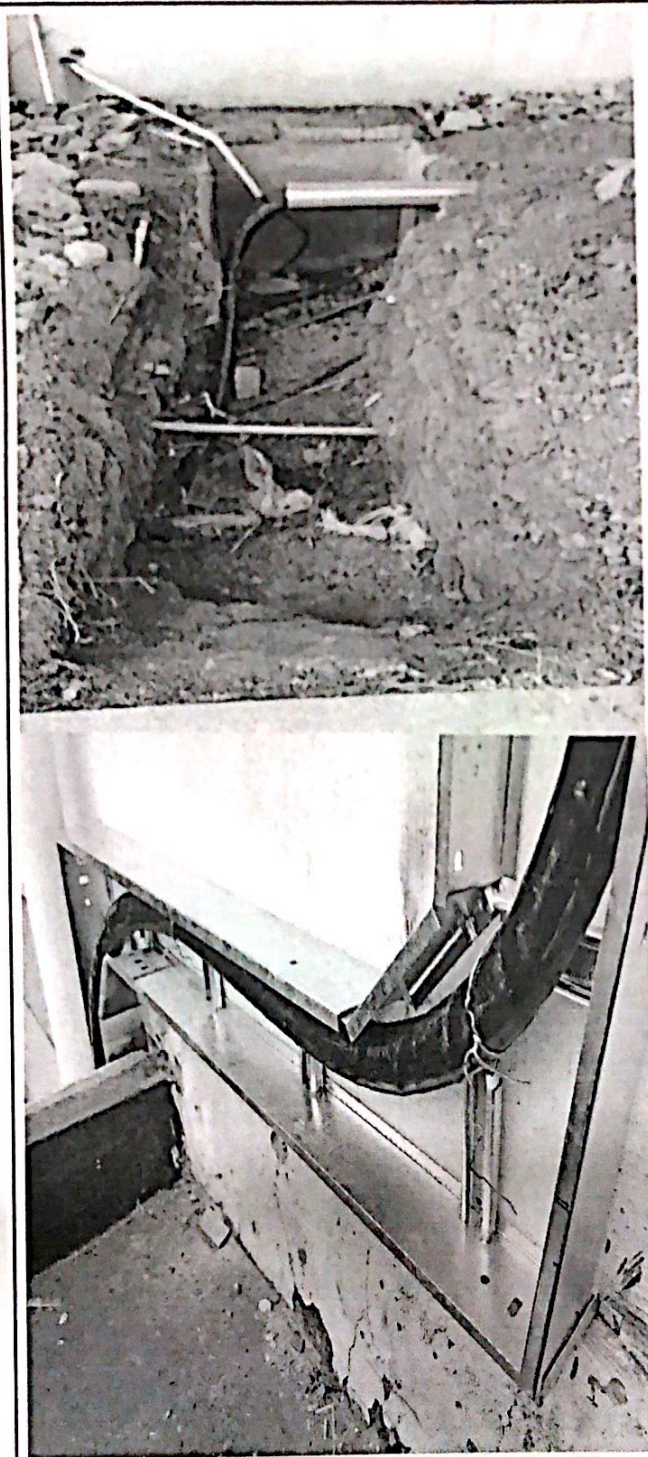

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。
