

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JLLX-001

致：四川垚州建设工程有限公司 施工项目部：

主题：关于对现场巡查发现问题事宜

内容：我监理项目部现场巡查发现以下问题

1、彩钢瓦屋面个别部位（角落）防腐除锈不到位，需安排施工人员对项目所占区域彩钢瓦屋面（逆变器及电缆桥架）进行除锈防腐处理，防腐处理需采用粉刷，避免污染组件。

2、光伏屋面个别接地穿刺片安装不到位，需安排人员进行检查整改。

3、光伏屋面电缆桥架跨接线不得使用铜编织带，需采用黄绿线接地。

4、施工单位需落实施工安全及技术交底内容。

针对以上问题，请贵单位收到通知后及时组织施工人员进行整改，并报审监理项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理



日

期：



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

问题一

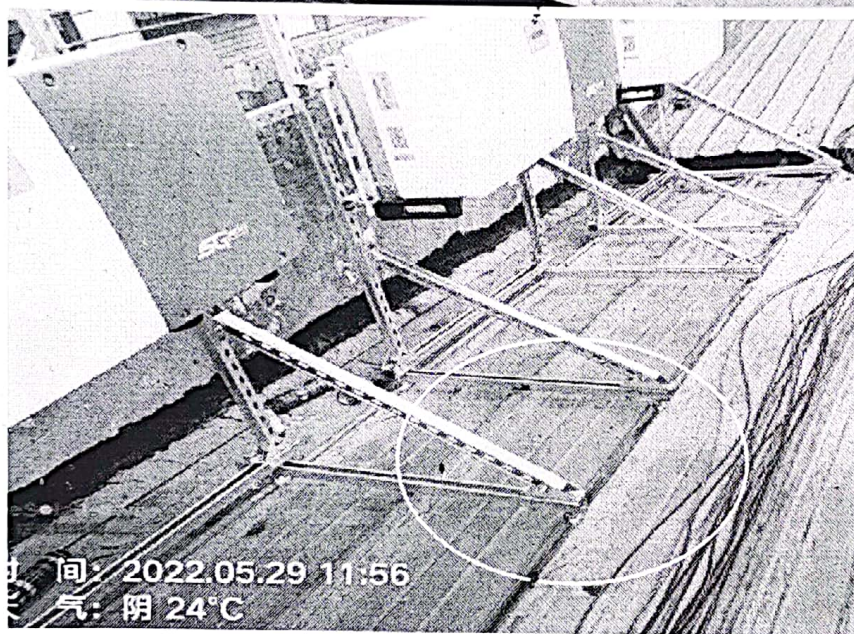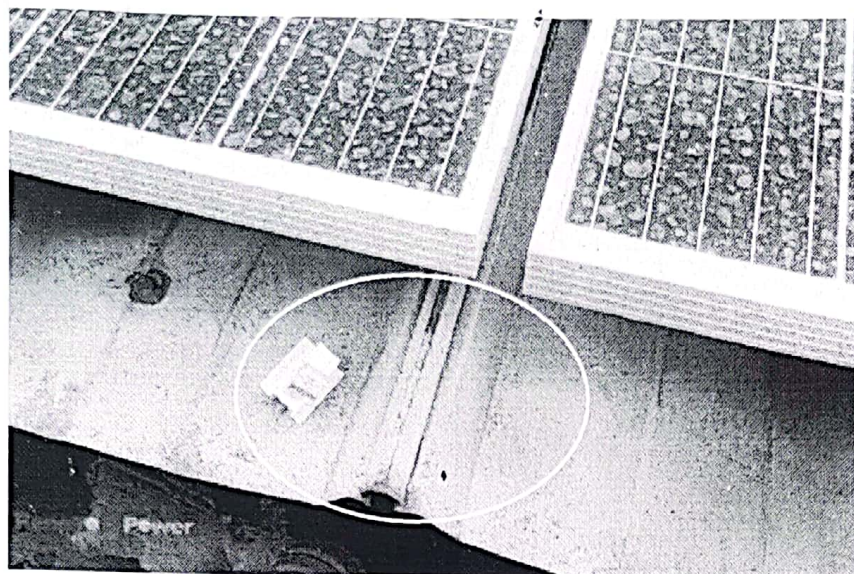

图二

