

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目


编号: ZHJL-HFTW-LXD-008

主送: 浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司(建设单位)

主题: 关于升压站地块回填土存在质量问题的相关事宜

内容: 监理工程师在升压站地块巡视检查时发现, 回填土内杂质较多, 达不到素土的标准, 不符合设计要求, 现要求施工单位立即停止升压站地块的土方回填作业, 按照设计要求采用素土, 禁止采用膨胀土或含杂质的土, 分层压实, 每层厚度均应 $\leq 300\text{mm}$, 压实系数不应小于 94%, 否则此段工作量监理项目部将不予确认。

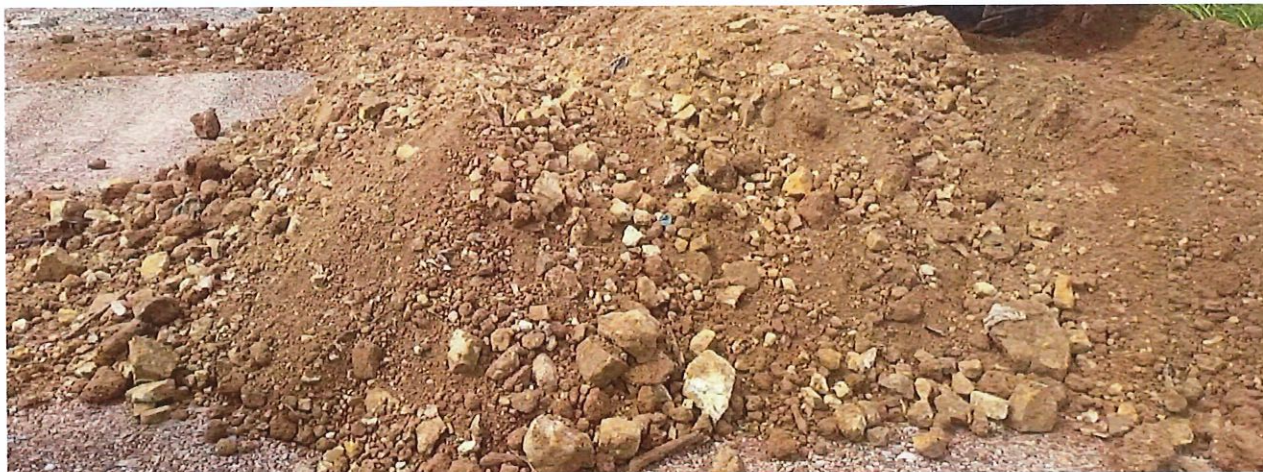

3. 场地平整时, 耕植表土应清除外运, 此部分土方共约 577m^3 , 由施工单位自行处理; 清除表土后, 填土方平整应水平分层压实, 每层厚度均应 $\leq 300\text{mm}$ 。填方工程压实系数不应小于 0.94。场地平整土石方施工质量应符合现行的有关规定。
4. 回填土应采用素填土, 禁止采用膨胀土或含杂质的土, 购土场及运距后期由施工及业主调查后确定。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2023年08月07日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。
