

监理工作联系单

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目 编号：CZZH-CJ-LX-009

致：山东电工电气集团有限公司 施工项目部：

事由：关于诸暨区域东白湖镇光伏电站整改消缺问题

内容：经近期东白湖镇现场整改消缺施工检查，发现你施工单位存在如下问题：

- 1、整改班组未按整改方案施工，组件随意堆放，造成组件破损、隐裂；
- 2、现场施工无任何安全、消防、防暑措施，施工安全得不到任何保障，屡次劝阻无效；
- 3、重点电气部位施工、高空作业等特种作业人员无证上岗；
- 4、破损防水未经修复直接安装瓦片；
- 5、破损防水、瓦片拆除后未做到及时修复。

针对以上问题，现责令你施工单位：

1、严格按照整改方案进行整改施工，若因组件随意堆放造成损坏、隐裂，一切损失将由你施工单位全部承担；若因组件施工损伤造成电站发电量达不到要求，此电站工程质量我监理方将不予认可，并上报业主单位拒绝或折价接收此电站。

2、施工班组重新进行安全三级教育；现场安全、消防、防暑措施必须落实到位，若你施工单位不听劝阻继续违规施工，一旦发生任何安全事故，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

3、特种作业人员必须人证合一，禁止无证作业，若你施工单位不听劝阻违规施工，一旦发生任何安全、质量事故，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

4、破损防水修复后方可安装瓦片，若你施工单位只做表面遮掩仍出现屋面漏雨现象，此电站工程质量我监理方将不予认可，一切损失将由你施工单位全部承担。

5、雨季施工，破损防水、瓦片做到当日拆除当日修复，若因你施工单位工作懈怠，一旦发生防汛问题，一切损失将由你施工单位全部承担。

附件：问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：陈永伟

日期：2023年7月4日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。




扫描全能王 创建




组件随意堆放



无任何安全防护

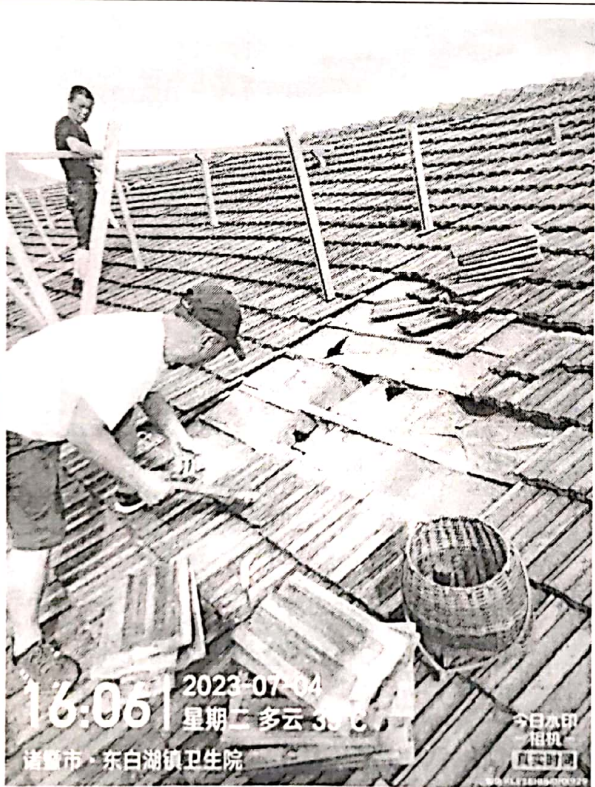

防水未修复直接安装瓦片

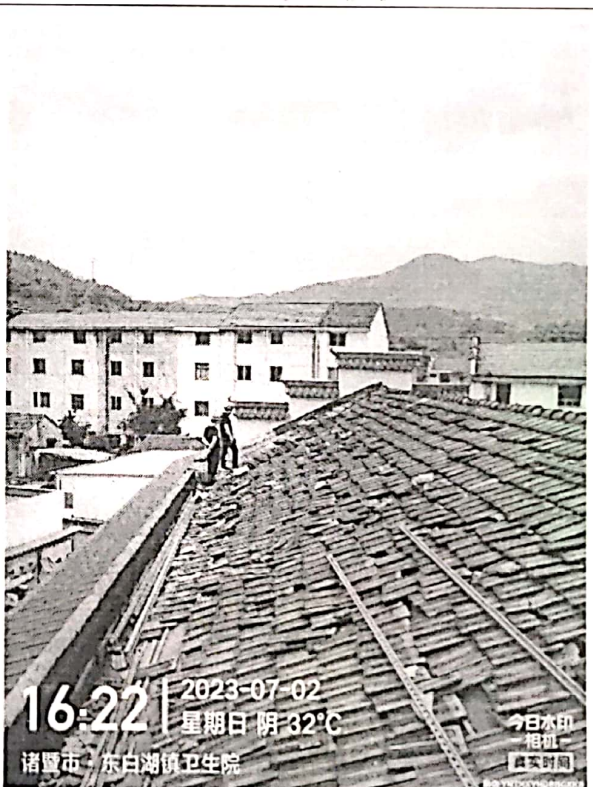

防水、瓦片未及时修复

