

监理工作联系单

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-LX-003

致：宁波兴晟新能源科技有限公司鹏程仓储施工项目部：

主题：关于厂房移交相关事宜

内容：因在肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司园区厂房屋面建设光伏发电项目，需对厂区屋面进行现场检查并签订屋面移交单，2025 年 06 月 28 日经厂区业主单位、监理单位、施工单位对厂房屋面检查发现以下问题：

1、1#、2#、3#厂房屋顶四面边缘存在漏水点，屋脊未打胶存在漏水，屋顶平面天窗胶面有老化开裂存在漏水；

2、屋顶平面彩钢瓦良好且无破损无生锈，但仓库存在漏水；

3、屋面多数漏水点不确定，只能确定个别漏点（位置标记如下）。

现我监理项目部要求你单位对厂区屋面漏水问题进行修缮，且在修缮完成后确定不漏水的情况下，签订屋面移交单书面文件。如厂区屋面漏水问题未进行修缮解决，禁止屋面安装组件，且延误的工期不予顺延，造成的损失由你方单位自行承担。

附：漏水点位置照片

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日期：2025 年 06 月 28 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版


手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



DB311—3131—98 位置存在漏水

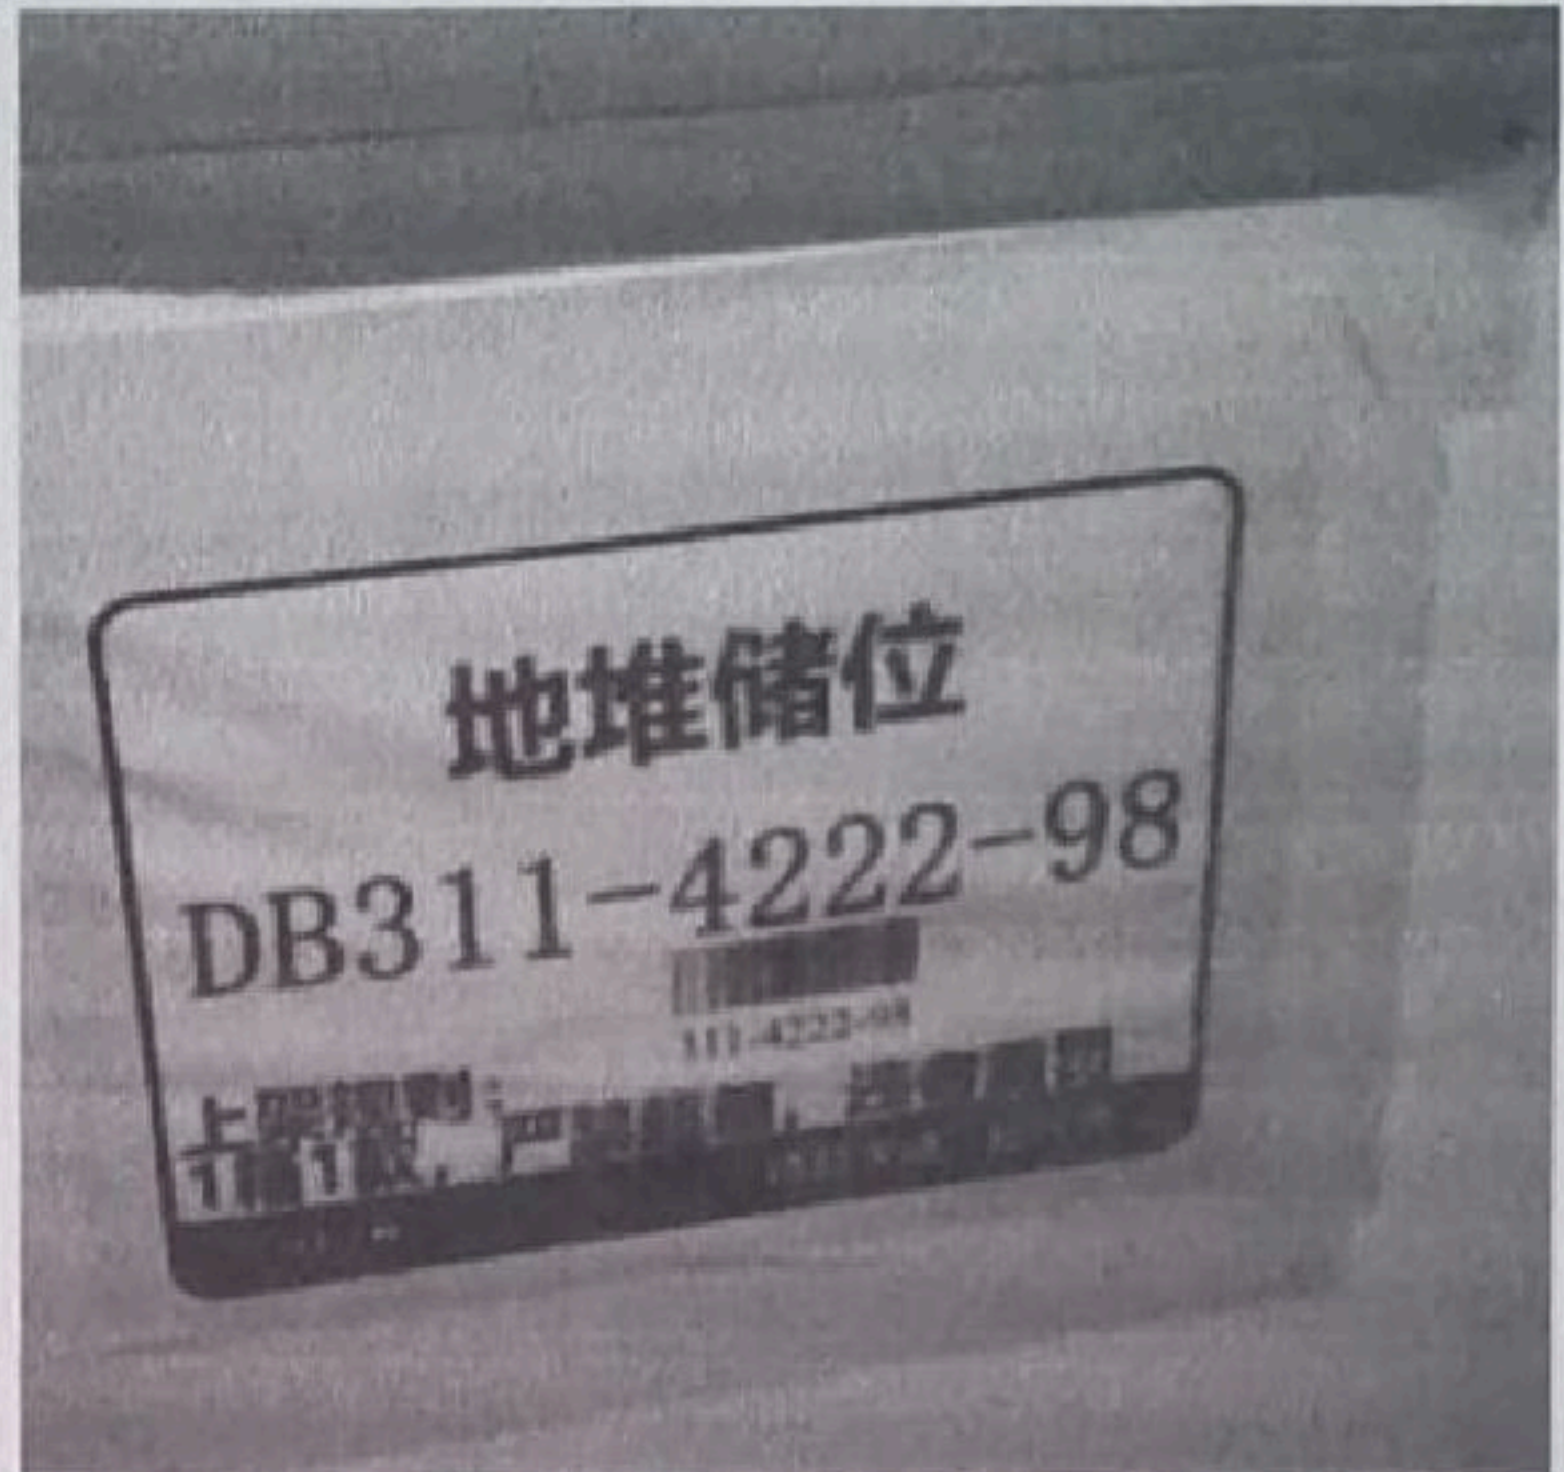

DB311—4222—98 位置存在漏水



DB312—2431—99 位置存在漏水

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备
