

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号: LYGGF-JLTZ-04



致: 西安大唐电力设计研究院有限公司 (单位)

主题: 关于主变、GIS 基础预埋铁及除锈防腐等事宜;

内容:

昨天在检查过程中发现以下问题:

- 1、GIS 基础预埋件未放于基础中间位置, 且表面粗糙, 观感质量较差, 接地块未放置。
- 2、预埋件及施工所用 H 型钢未进行除锈防腐。

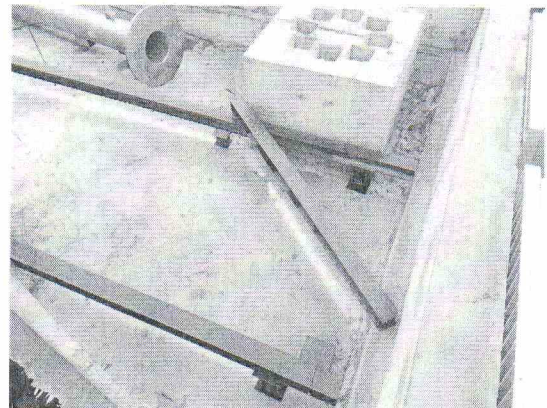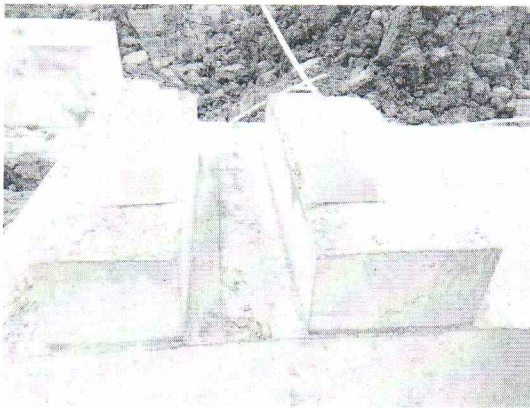

要求:

- 1、GIS 预埋件必须按图纸要求放置在相应位置, 与边缘平行, 标高误差小等于 3mm, 混凝土表面平整, 无凹凸, 无蜂窝麻面。
- 2、施工中所用的预埋件及 H 型钢必须进行除锈防腐。

上述问题整改后, 由三方会检合格后方可进行下一步施工。书面回复。

限 3 个工作日内完成;

抄送: 建设单位 (业主)

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师

日期: 2016.11.26

填报说明:

本表一式 4 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。
