

监理工程师通知单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目


编号：CZZHJL-YZHS-006

致：河南易通电力工程有限公司；

主题：关于箱逆变基础底部回填碎石，未经验收浇筑垫层的问题；

内容：经监理现场巡视发现你单位 8#、9#箱逆变基础未通知业主及监理验槽，自行浇筑垫层，并且发现 8#箱逆变基础底部用乱石及浮土回填，与设计要求严重不符，现要求你单位对基坑底部乱石及浮土重新清理，整改完成报业主及监理验收后方可进行垫层浇筑。

限 3 个工作日内回复。

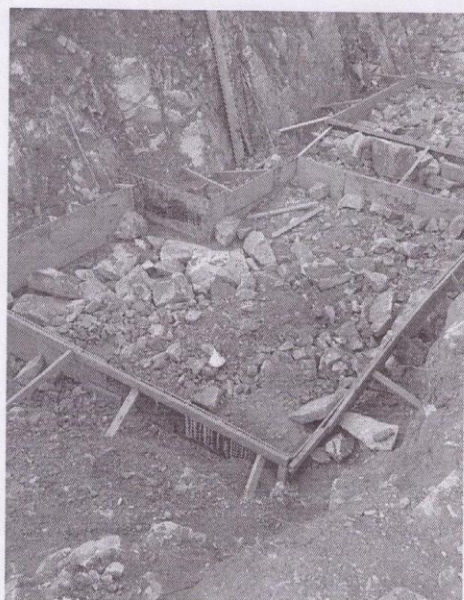

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：

2016.05.01
监理项目部

注：本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 2 份。
