

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 大城县 15 兆瓦光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-TJ-001

致: 四川天沛水利水电建设工程有限公司 项目部

主题: 关于施工现场回填土事宜

内容: 你单位回填施工过程中未按规范要求施工, 要求你单位对现场施工过程中存在的以下问题做出整改 (详见附页图片):

1. 场地清表过程中所清除的杂草、灌木未集中堆放处理。
2. 施工人员随意往部分即将回填的沟渠内倾倒杂草、灌木。
3. 沟渠回填施工前未清除沟渠内杂草、青苗。

另:

1. 因场地内存在输电设施请你单位施工过程中注意保护, 避免对输电设施造成损坏。

2. 已完成回填土施工的区域及时进行压实, 避免因下雨后土壤含水率较大, 碾压时出现弹簧现象影响压实质量。

限 5 个工作日内完成

抄送: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城项目部

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:

日期: 2016.7.10.




填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。



回填前未清除青苗及杂草

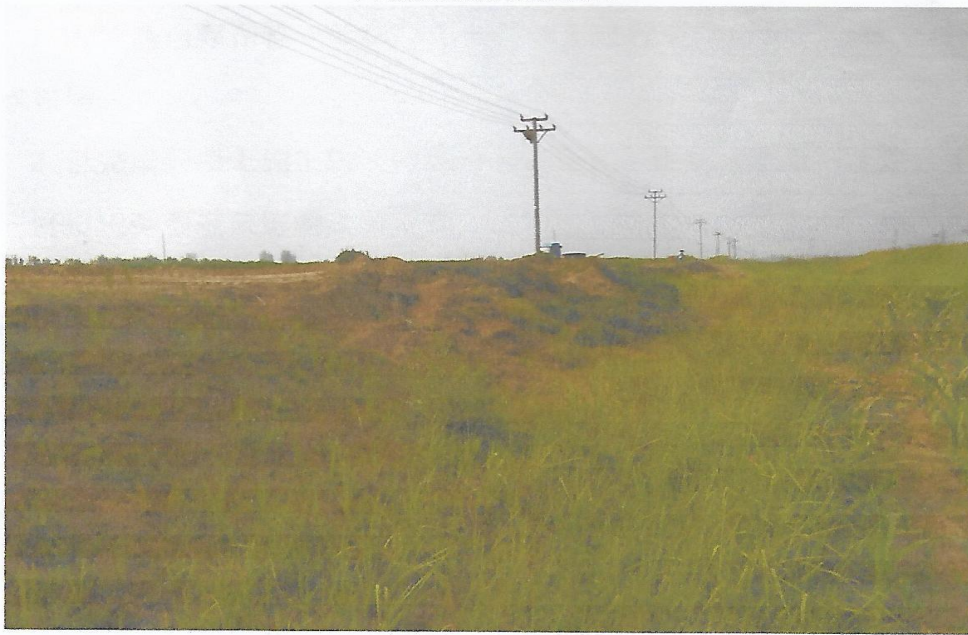

杂草及青苗随意倾倒
