

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目

编号：2016-09-01

致：青海首信建设工程有限公司（施工单位）

主题：

关于现场设备基础基层处理事宜

内容：

经现场检查发现你单位在变电站设备基础基槽清槽过程中，工人采用打夯机夯平槽底虚土，严重违反了基坑槽底处理规范要求，为工程质量留下隐患。现通知你单位停止基槽清理作业并继续开挖至原土持力层，采用人工清槽。经各方共同验槽合格后方可进行下一步施工。

限 2 个工作日内完成

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：

填报说明：

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目



编号：2016-09-01

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 2016-09-01 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

针对监理通知，我单位对变电站设备基础基坑清理作业方式做出了整改，立即停止打夯，采用人工清槽的方式清理 20cm 至未被扰动的原土持力层。现已整改完成。

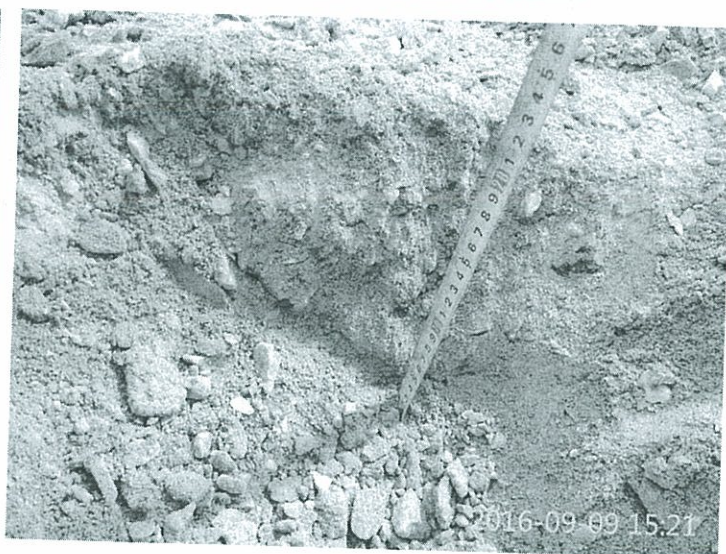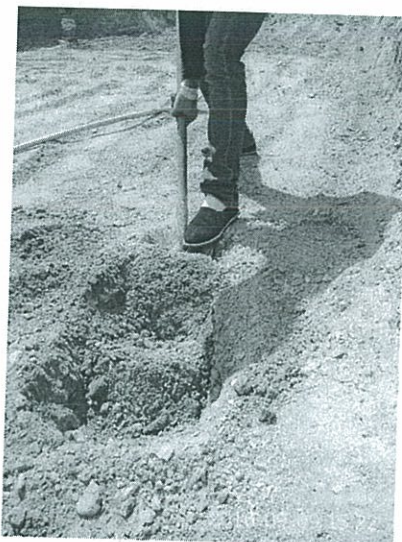

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

2016.09.10

项目监理机构复查意见：

已整改，可以进行下一步施工。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：

2016.09.10

填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
