

监理工程师通知单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：JQ1-ZHJL-JLTZD-2017-009


致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：关于 22 单元汇流箱至逆变器电缆整改事宜及组件安装注意事项

1. 施工单位在未通知监理及业主方的情况下，私自将 22 区共计 15 根 2*50 直流电缆进行接续，并进行电缆沟回填。被我监理方在巡视过程中发现，经汇报业主，现要求施工单位提供汇流箱至逆变器的电缆整改方案并将该段电缆全部进行更换，或者是更换电缆走向，保证不出现中间接头且接头不在同一位置，按照施工工艺进行敷设，确保电缆带电后安全运行。

2. 我监理及业主方在巡视过程中发现组件安装中有工人站在组件板上件板（见附图），有可能造成电池片隐裂，组件厂家对施工人员已做培训，一再强调施工过程中禁止踩踏组件，望贵单位引起重视，做好技术交底。

附图：

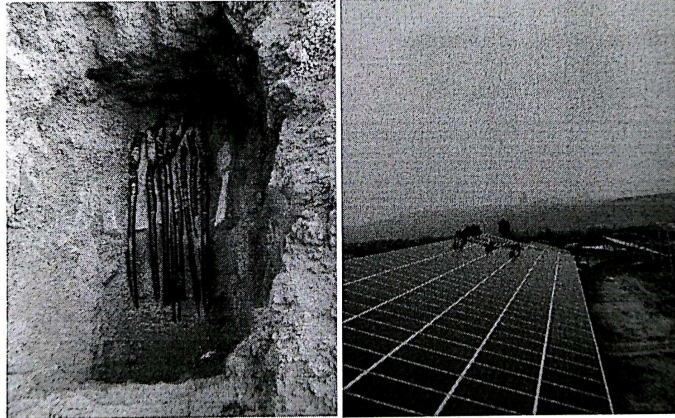

此监理工程师通知单要求三日内回复。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：叶玉泉

日期：2017 年 4 月 25 日

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位
