

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--012

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：施工质量问题。

- 内容：1、监理业主共同检查 6#7#区支架安装不到位，中压块间隙过大。
2、光伏板安装不平整，光伏板与檩条的连接处绝对不允许加垫块。
3、檩条与斜梁的连接处（固定螺丝）不允许斜装。
4、支架螺丝拧紧与斜坡角度达到要求后才允许安装光伏板。
5、要求施工单位管理人员加强质量检查力度，并对支架安装人员技术交底。

限 3 日答复。




监理项目部(章)

总/专业监理工程师：郭艺海

日期：2017年4月8日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

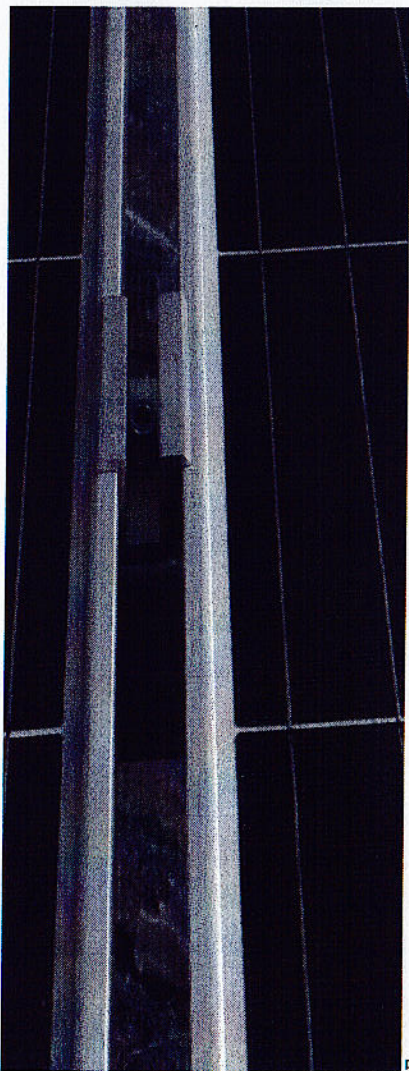

中压块间隙过大

垫块

