

监 理 通 知 单

工程名称:仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目

编号:XJGF-JLT01-004

致: 正泰国际工程有限公司

事由: 灌注桩事宜:

内容:

经我监理巡查发现, 你单位灌注桩施工存在以下问题

- 1、未对监理通知单 XJGF-JLT01-003 进行整改回复就已进行下一道工序施工。预埋件与图纸严重不符。
- 2、依据施工蓝图要求, 桩孔深度必须在 1500mm-2000mm 之间, 但是现场实际测量桩深度大部分在 1300mm-1500mm 之间, 不符合设计要求 (详情见附件一)。

现要求你单位对不满足设计要求灌注桩, 按照蓝图预成孔灌注桩整改到位, 未整改完成不得进行施工, 否则一切后果由你单位负责。







监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王峰

日期: 2016 年 12 月 20 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

附件一

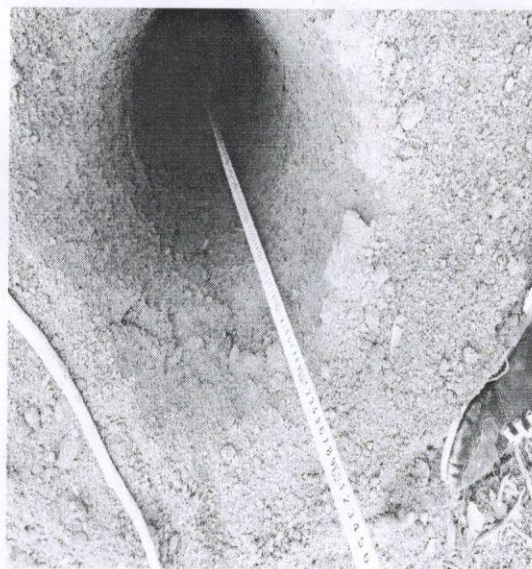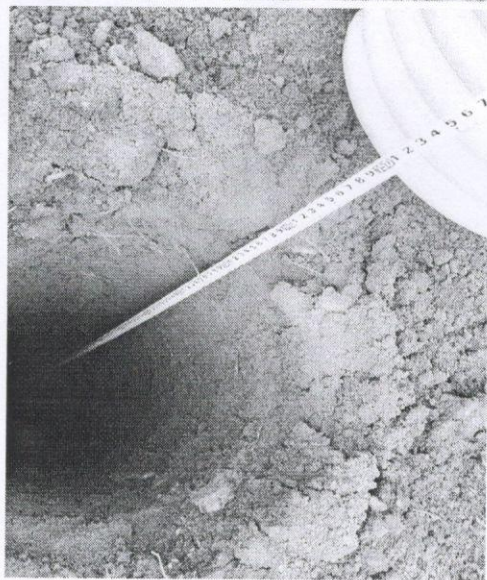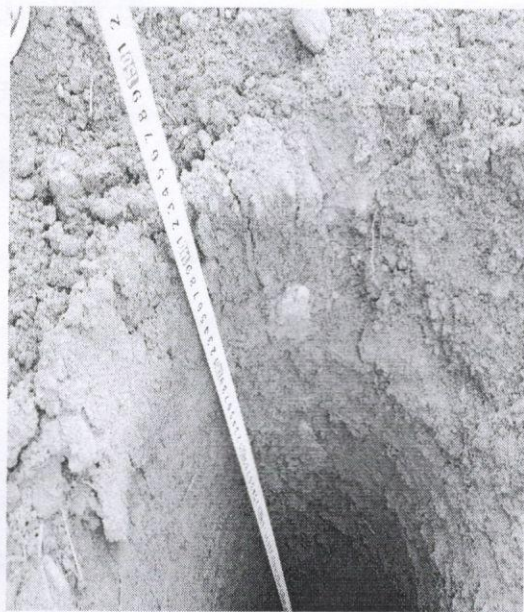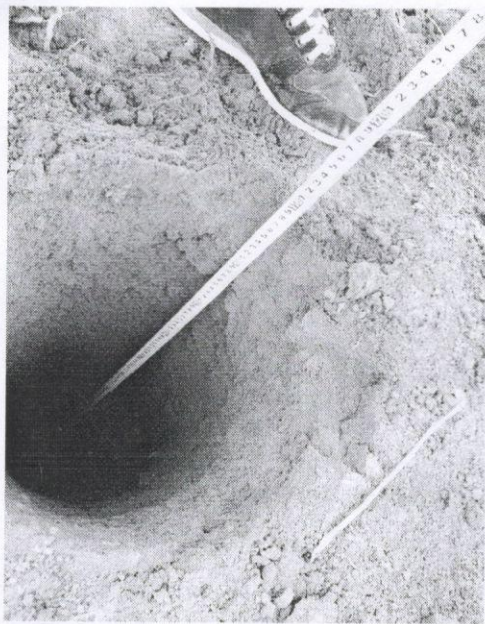

监理通知回复单

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: XJGF-JLT01-004H

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 XJGF-JLT01-004 的监理工程师通知后, 已按要求完成相关工作。

1、我方已严格按照蓝图进行施工, 桩孔深度保证在 1500mm-2000mm 之间。

附: 整改照片

施工项目部 (盖章)

项目负责人 (签字):

日期: 2016.12.23



复查意见:

已整改完成

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字):

日期: 2016.12.27



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

