
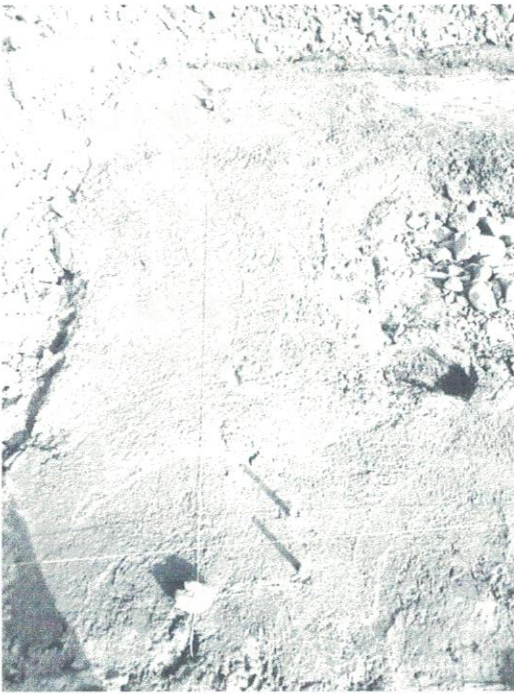


监理通知单

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号：ZHJL—XST—20161021

施工项目经理部 签收人姓名及时间		建设单位签收人 姓名及时间	贾建强
致： <u>江苏华能建设集团有限公司</u>（施工项目经理部） 事由：关于现场条形基础浇筑相关事宜 内容： 今日我监理部人员在现场巡视，现场施工混乱，技术交底不到位，施工人员在施工过程中严重不负责任，现提出整改项如下： 1、开挖基础石头未清理，施工人员就进行浇筑，严重达不到配重要求。 2、钢筋笼变形严重施工人员未进行调整就进行浇筑，现场要求多次还是未见效果，施工质量无法得到保证。 3、预埋件水平度，垂直度、轴线偏差严重。 4、部分预埋件未置于钢筋笼内部，达不到设计要求，严重影响抗拉拔力要求。 现要求你单位对以上问题进行整改，整改完成报监理部验收，如再次出现此类问题我监理项目部将要求停工培训，并行进处罚 如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。 附件共 <u>1</u> 页，请于 <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日前填报回复单。 项目监理机构(章):  专业监理工程师（签字）: <u>王林</u> 2016 年 10 月 22 日			
注：1、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。			

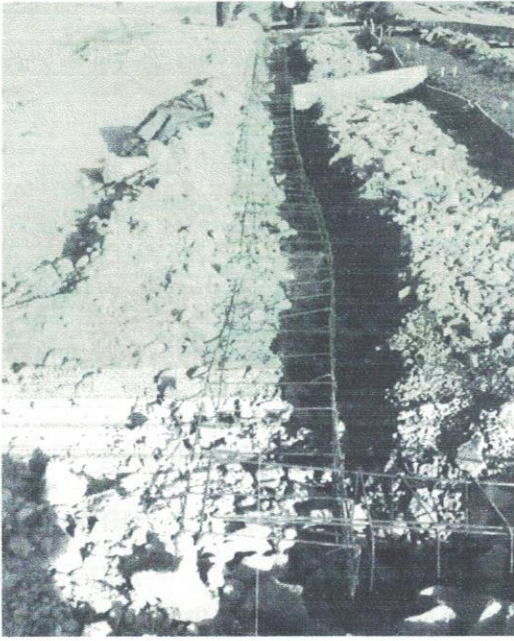

五
木
