

监理通知单

工程名称：衢州杭泰柯城 160WM 光伏发电项目

编号：QZHT-ZHJL-ZL-009

主送：中易建设有限公司

抄送：衢州杭泰光伏发电有限公司

事由：关于 15MW 光伏去桩基孔内塌方及积水问题；

内容：因昨天及昨夜大雨，今早上 8:00 监理在经现场巡视检查光伏区，发现现场桩孔内大部分积水，而且很多是孔内满水，现场桩孔塌方也很多，给桩基浇筑带来很多隐患，为了保证工程质量要求中易公司做好桩基浇筑前的准备工作。

- 1 做好光伏区施工现场抽排水准备。
- 2 做好光伏区桩基塌方的清孔工作。

为了保证工程质量要求中易公司接到监理通知后做好以上施工准备工作。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期 2017 年 3 月 20 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

桩基坑内积水

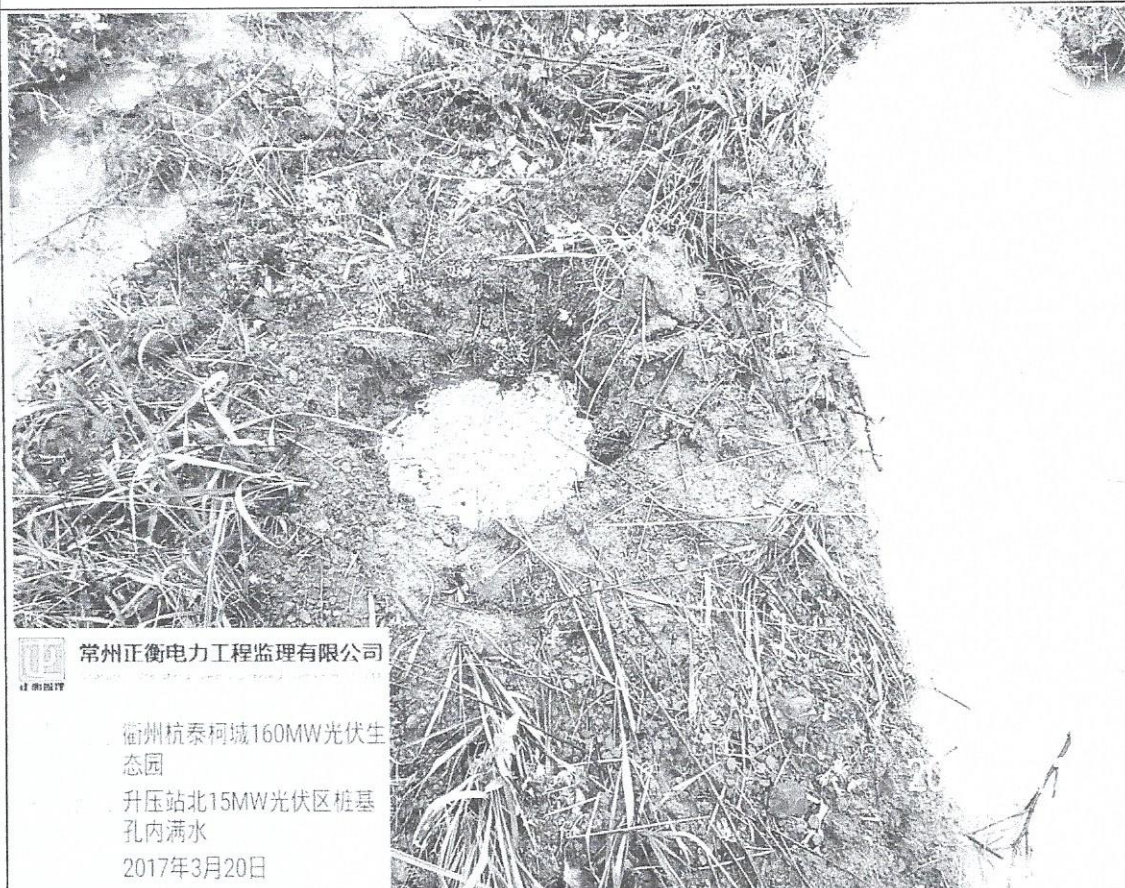

常州正衡电力工程监理有限公司

CHANGZHOU ZHENGHENG POWER ENGINEERING SUPERVISION CO., LTD.

衢州杭泰柯城160MW光伏生态园

升压站北15MW光伏区桩基孔内满水

2017年3月20日
