

监 理 通 知 单

工程名称:衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: QZHT-ZH -JL-ZL

致: 中易建设有限公司衢州柯城项目部

事由: 现场施工质量问题


内容: 2017 年 8 月 5 日, 在 34 区稻田灌注桩浇筑施工时发现以下问题

1. 施工现场安全防护较差, 机械旁施工人员无佩戴安全帽, 现场灭火器无配备, 临时用电电线到处拉扯
2. 桩机打孔深度达不到要求, 且未及时清理桩孔就下放钢筋笼进行浇筑
3. 灌注桩浇筑时振捣不均匀, 现场采用的模具绑扎不严实, 出现漏浆爆模等情况

现要求你部: 1. 做好现场施工人员安全技术交底, 现场安全防护用品配备到位

2. 对现场桩机钻完孔及时清理, 待建设方现场负责人及我部做好现场测量后, 达到要求后方可进行下放钢筋笼进行浇筑作业施工

3. 灌注桩浇筑时振捣要均匀, 模具绑扎需严实, 杜绝漏浆爆模等现象发生, 否则我部将要求进行返工处理

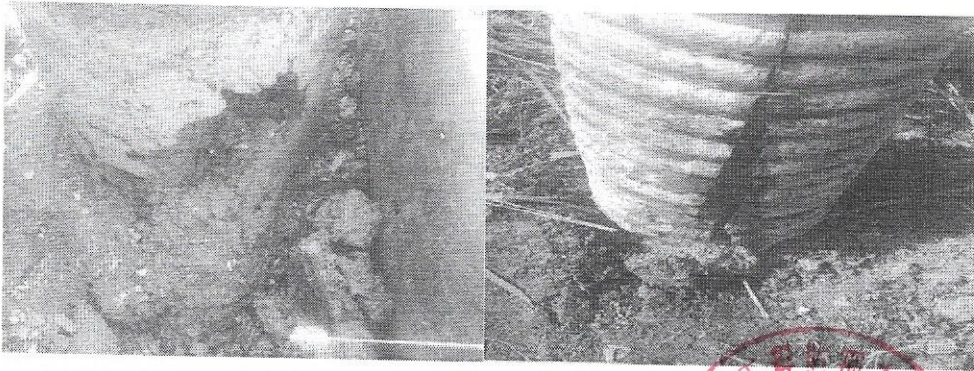

监理项目部: (章)

专业监理工程师: 李通春

日期: 2017 年 8 月 5 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。
