

监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区 P4 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-005

致：江苏宏大建设集团有限公司


抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：

关于电气楼楼板渗水问题

内容：

监理在 2017 年 2 月 27 日下午日常巡视过程中发现电气楼楼板存在大面积严重渗水现象，为了不影响下一道工序施工，现要求你单位对渗水部位进行整改修复，整改完成后报我监理部验收；验收合格后方可进行下一道工序施工。否则一切后果由你单位承担。另你单位在收到此通知三天内给予我监理项目部书面回复。

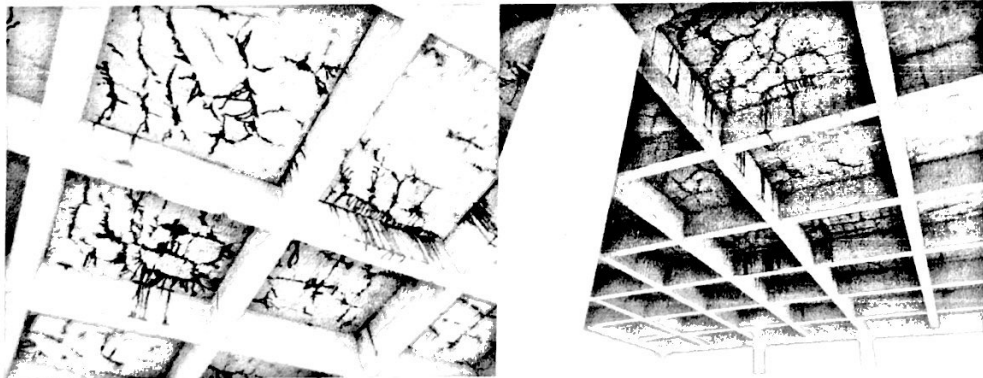

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王峰

日期：2017 年 2 月 27 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
