

监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区（P2区）110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-008

致：陕西银泰建筑工程工程有限公司

抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：

关于 P2 区 110KV 升压站现场施工质量问题

内容：

2017 年 3 月 12 日我监理巡查发现你公司在施工过程中存在以下问题：

- 1、电气楼排架东西向无剪刀撑，南北向剪刀撑角度不符合规范要求。
- 2、电气楼排架大跨度梁底中间排架支撑不到位。
- 3、电气楼排架立杆底部悬空，未有可靠支撑。
- 4、水泵房集水井位置与图纸不符，且深度不符合要求。
- 5、水泵房防水卷材铺设不符合规范要求，搭接长度不够。

为了保证工程质量，进一步提高施工现场安全文明施工，以上问题要求你单位在 2017 年 3 月 14 日前给予我监理部书面回复，并在整改完成后通知我监理部验收，验收合格后方可进入下一道工序，否则一切后果由你单位负责。另水泵房集水井位置与图纸不符，我监理部已多次提醒，但你单位仍然未按要求进行整改，并且已进入防水施工，现要求你单位将防水卷材移除，对集水井进行整改。若再次出现此类情况，将对你单位实行经济考核。

附件：问题照片 3 张


监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 03 月 12 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

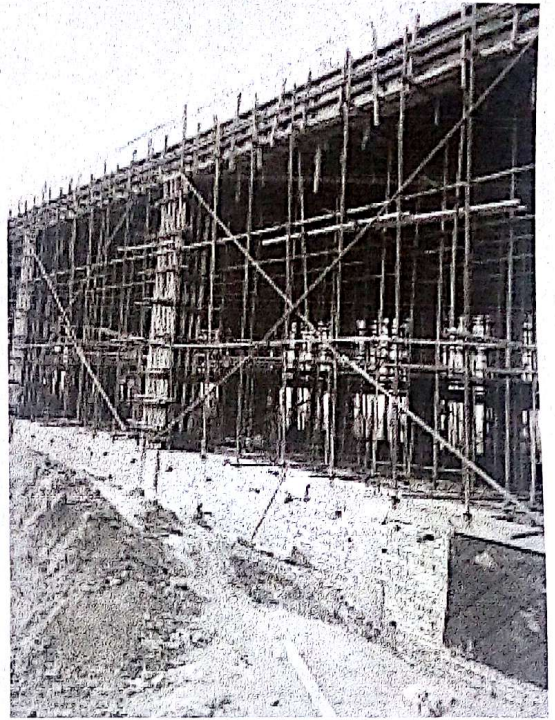

监理工程师通知回复单

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110KV 升压站 p2 区建设工程

编号: A6-008

致_常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:


我方接到编号为 GBJGF-B1-008 的监理工程师通知后, 对存在的问题进行逐一整改, 具体整改内:

- 1、电气楼满堂脚手架搭设不规范已按脚手架搭设规范整改。
- 2、电气楼梁底支撑已按要求在梁底杆中间部位加立杆支撑。
- 3、电气楼脚手架底部悬空处已用垫板垫实, 无悬空。
- 4、水泵房集水坑位置、深度已按施工图设计要求整改 (附图)。
- 5、水泵房防水铺设已按要求整改。

请予以复查。

详细内容:

根据项目监理机构所提出的要求, 我司在接到通知后, 立即停止了该部位的焊接工作, 并组织召开施工班组交底, 组织工人对不符合要求的部位进行了整改, 未验收合格前不得进入下道工序。

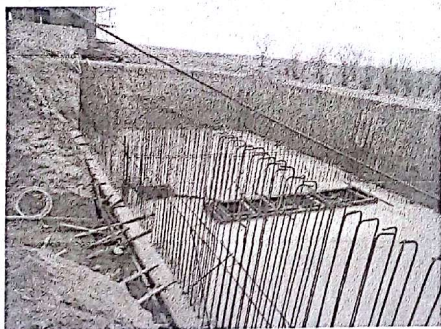

附件:

施工项目部 (章):

项目经理: 杨成功

日期: 2017.3.16

监理项目部复查意见:

经复查, 已对通知单中的问题进行整改。

监理项目部 (章):

总/专业监理: 王峰

日期: 2017.03.16

注 本表一式 四 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。
