

监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-012

致：陕西银泰建筑工程有限公司

抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：

关于 P2 区综合楼施工质量事宜

内容：


2017 年 04 月 10 日上午 08 时监理在 P2 区 110KV 升压站巡视中，发现你公司在

1、综合楼卫生间墙体砌筑，未按图纸要求浇筑 200mm 高与墙同宽导墙，存在渗水隐患。

2、综合楼屋面保温板已进场，但材料规格型号不符合图纸设计及规范要求，存在严重的质量及安全隐患。

为了保证工程质量，你单位在收到此通知后，立即对以上问题进行整改。整改完成后报监理部验收，验收合格后方可进入下道工序。你单位在收到此通知后，在 2017 年 04 月 17 日前给予我监理部书面回复。

问题照片：

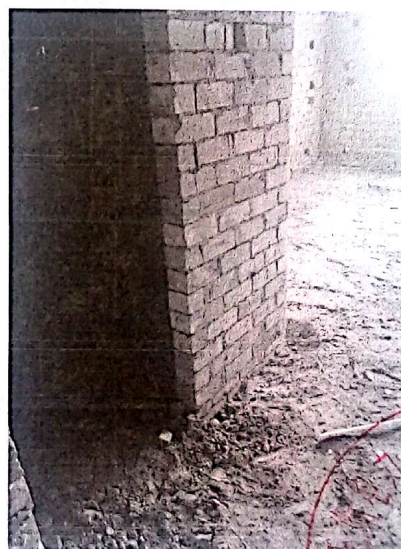

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

王峰

日期：2017 年 04 月 12 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理工程师通知回复单

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110KV 升压站 p2 区建设工程

编号: A6-012

致_常州正衡电力工程监理有限公司_监理项目部:

我方接到编号为 GBJGF-B1-012 的监理工程师通知后, 对存在的问题进行逐一整改, 具体整改内容如下:

- 1、综合楼卫生间砌体墙下做 200mm 高与墙体同宽导墙已按照施工规范要求施工完成。
- 2、综合楼屋面保温材料按照施工图设计要求进行施工, 不符合设计要求材料已清出施工现场。

请予以复查。

详细内容:

根据项目监理机构所提出的要求, 我司在接到通知后, 立即停止了该部位的焊接工作, 并组织召开施工班组交底, 组织工人对不符合要求的部位进行了整改, 未验收合格前不得进入下道工序。

附件:

施工项目部 (章):

项目经理:

日

期:

2017.04.16

监理项目部复查意见:

经复查以对以上问题进行了整改

监理项目部 (章):

总/专业监理:

日 期:

2017.04.16

注 本表一式 四 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。
