

监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-021

致：江苏宏大建设集团有限公司

抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：

关于 P3 区综合楼配电箱内断路器安装质量事宜

内容：

2017 年 06 月 23 日上午 09 时监理在 P3 区 110KV 升压站巡视中，发现你公司在综合楼安装的配电箱内断路器不符合设计及规范要求，

1) 未按图纸要求安装配电箱 (800*600*200) 及漏电断路器 (型号: NMILE-400A 漏电断路器) 实际安装 DZ47sLE C63A



2) 支路开关配备不合理，未按容量正确安装漏电断路器

3) 支路导线截面全部采用 4^2 单股铜线，未按容量正确配备

4) 配电箱内接线工艺差，线路排列不整齐，开关未粘贴用途标示牌

为了保证工程质量，你单位在收到此通知后，对场区内所有配电箱进行自检，严格按照设计及规范要求安装，并对以上问题整改，自检合格后报监理部验收，否则产生的一切后果将由你公司承担。

问题照片：

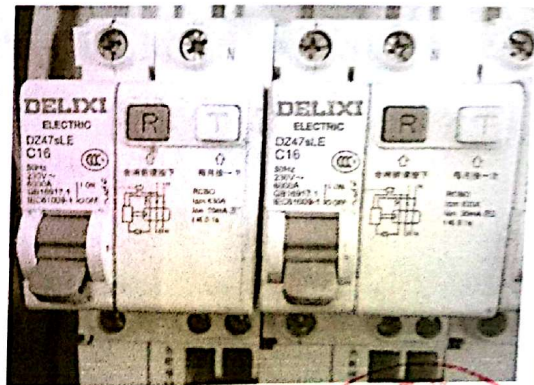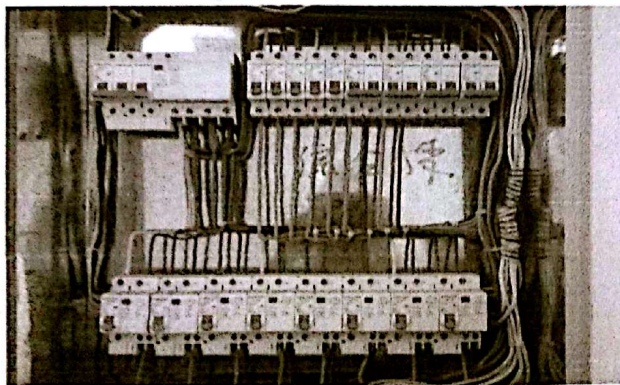

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：韩4.明

日

期：2017年06月23日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建
