

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号: GL005

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 关于工程施工中存在的安全隐患:

内容: 1、厂区屋面材料堆放杂乱。

2、上屋面爬梯固定螺栓松动, 爬梯与墙面不能可靠连接。

3、桁架加工设备电焊机、切割机, 配电箱无临时接地。

4、桁架加工临时用电不规范, 不符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 中三级配电二级保护(一机、一闸、一箱、一漏)的要求。

5、氧气、液化气与电焊机的不能满足规范规范要求的的安全距离 5 米。

6、进场工人的三级安全教育至今未按要求落实。

对于以上工程中存在的安全按隐患, 限你单位于 2017 年 02 月 18 日前整改完毕。

附件: (安全隐患照片)

监理单位(章)


总监理工程师: 朱家军

日期: 2017年02月16日






屋面材料堆放不整齐

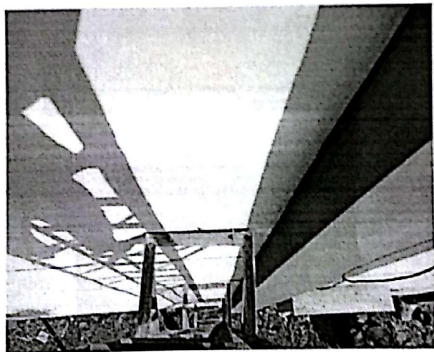

爬梯螺栓松动不牢固

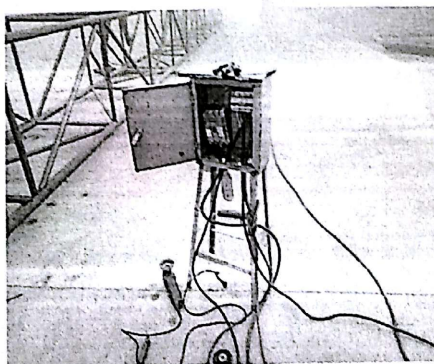

配电箱无接地、接线不规范



电焊机无接地、无合格证



临时用电规范不规范、电线、电缆乱拉乱扯

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。
