

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: JL011

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 电缆桁架吊装出现的质量及安全隐患


内容:

你单位施工的山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目为保证施工进度, 业主项目部、监理项目部多次口头通知、书面督促, 仍不能及时报审:


- 1、桁架梁安装平整度太差, 倾斜严重。
- 2、桁架梁、支座、化学植筋预埋的钢板不能可靠连接、焊接工艺较差、焊缝不符合图纸设计及规范要求。
- 3、桁架与支座连接不符合图纸设计及规范要求, 轴线位移偏差过大, 全部切割支座稳固桁架严重违反图纸设计及规程规范要求。

对于以上问题现已上报业主单位审核, 我方监理对于此野蛮施工的现象建议停工整改, 待以上质量问题整改闭环完毕后, 方可进行吊装桁架的作业, 如你单位仍拒不整改, 由此造成的损失由你单位自行承担。




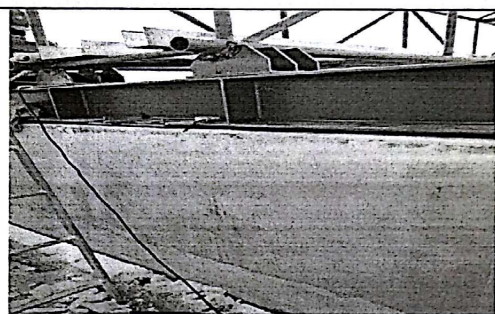

桁架梁安装严重倾斜

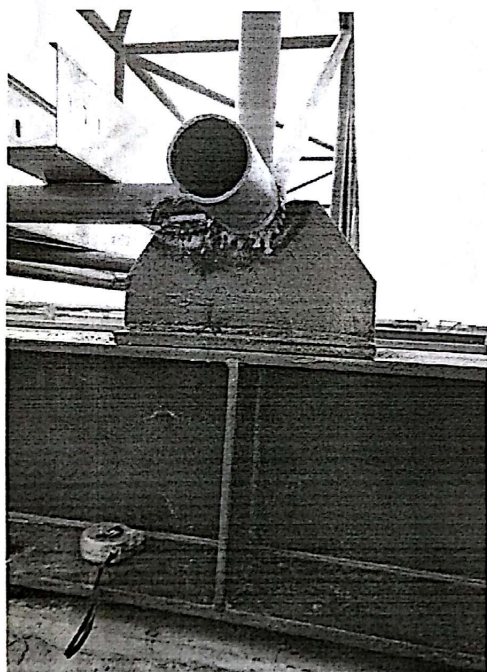

桁架与支座连接不符合图纸设计及规范要求

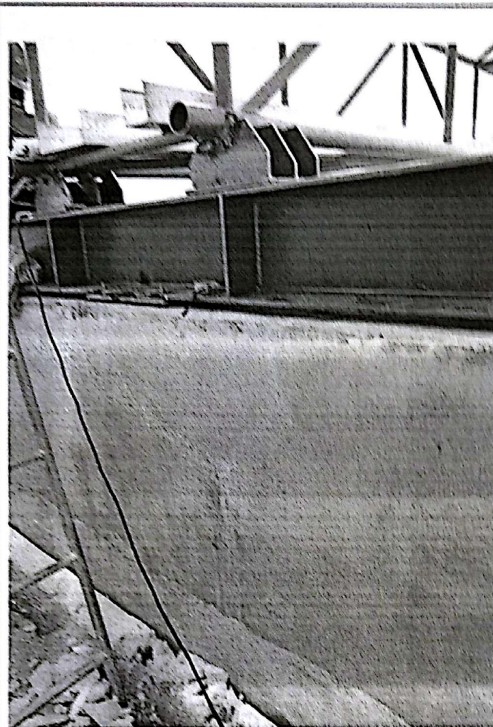

乱割、乱焊野蛮施工



桁架吊装野蛮施工

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。
