

监理工程师通知单

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目 编号：ZHJL-FZ-005

致：西藏东旭电力工程技术有限公司：

洛阳强盛电力工程技术有限公司：

抄送：洛阳丰墨新能源有限公司：

事由：关于围网施工有关质量问题：


内容：经监理工程师及建设单位现场巡检时发现以下问题：

- 1、基础孔深有不足500mm、孔径不足300mm现象，砼为现场搅拌，无配合比，无法保证砼强度c25，并要求砼捣实；
- 2、钢管埋深不足 450，两根钢管间距不足 3m 导致两张铁丝网未搭接在钢管处，不能保证围网强度；
- 3、铁丝网上边与钢管顶端未在同一水平处；
- 4、铁丝网部分在钢管内侧，部分在钢管外侧，建议统一放在钢管外侧增加强度；
- 5、抱箍卡不要离钢管顶端太远，三个抱箍卡要均匀放置；

项目监理机构(章)：

监理工程师：


日期：2017年3月9日

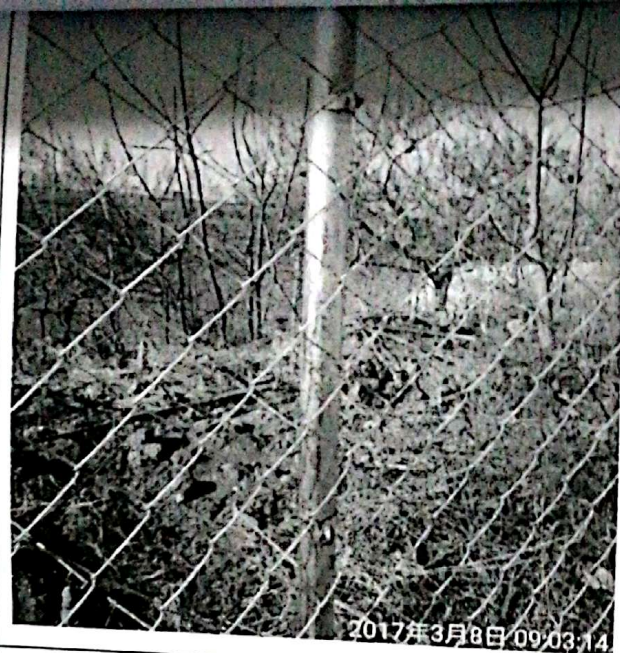


2017年3月8日 09:03:14



2017年3月8日 09:03:05

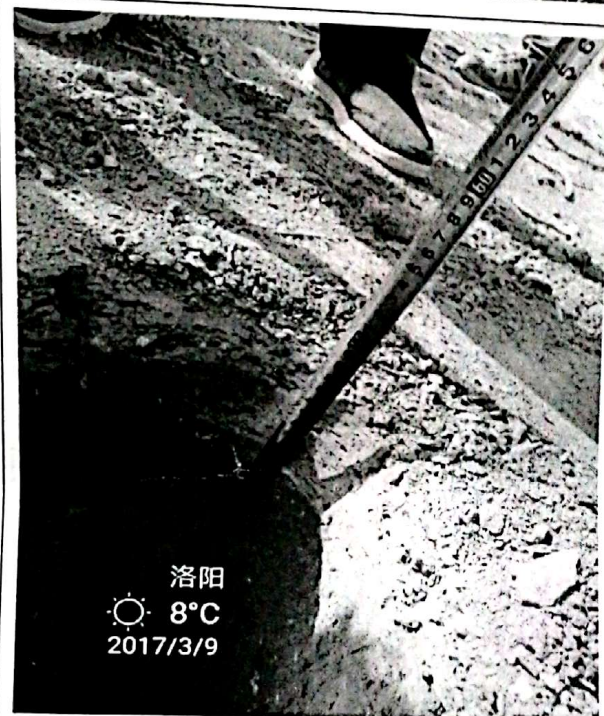


洛阳
8°C
2017/3/9

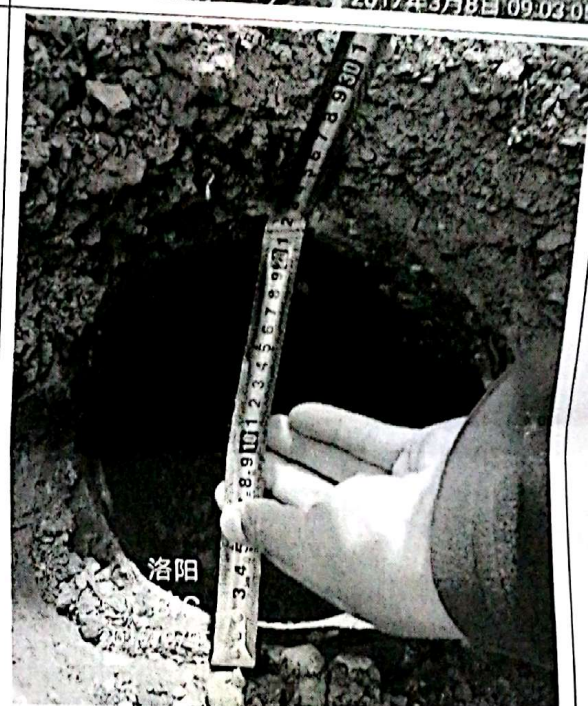

洛阳



2017年3月7日 15:15:46

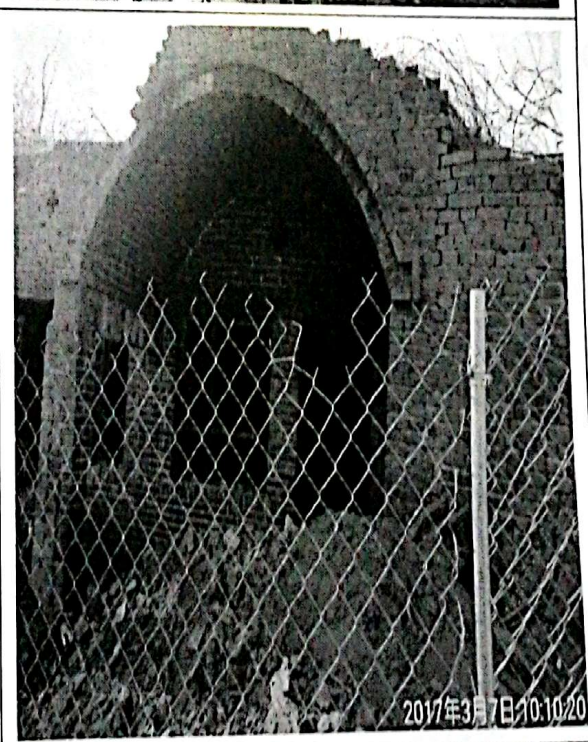

2017年3月7日 10:10:20
