

监理通知回复单

工程名称：乾安县通威惠金 15MW 渔光互补（扶贫）光伏项目

编号：002

致 乾安县通威惠金 15MW 渔光互补（扶贫）光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CZZHJL — TWHJ — 002 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

安全质量问题

1、施工现场温度太低（-17° 左右），不具备桩顶帽防锈的施工条件，待气温回升至零摄氏度以上再进行施工。

2、公路进入现场入口处的通讯线问题已联系当地的电信部门，协同进行处理。

3、施工现场材料堆放区，已进行分类处理与加工并设置相应的安全警示标示标牌。

4、施工单位临舍锅炉房周围的材料已进行处理，并配置相应的灭火器。

5、现场已按照临时用电要求，对临时用电进行整改，严格按照“一机 一闸 一漏 一箱”的要求进行配置。

6、施工现场油桶已放置在固定的存放点并配备灭火器等防火措施。

7、专职安全员已回工地。

资料问题

部分资料已经完善，部分资料需要协同各部门，尽量完善。

附件：另附施工现场照片

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

2017.01.19

监理项目部复查意见：

经复查整改后，符合要求


监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：


日期：

2017.01.19

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

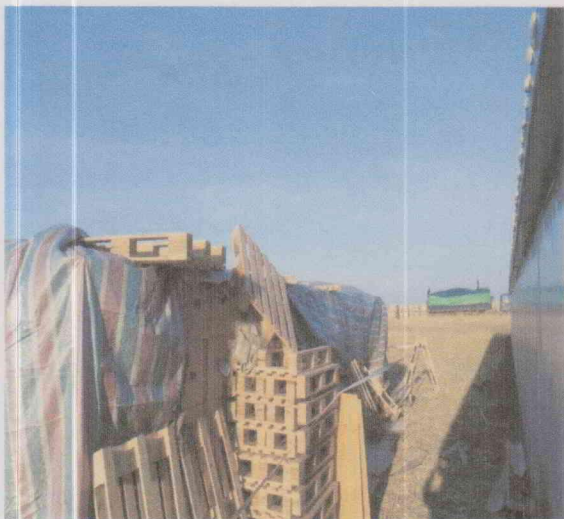


临舍区材料已进行清理、并使用安全警示带进行维护

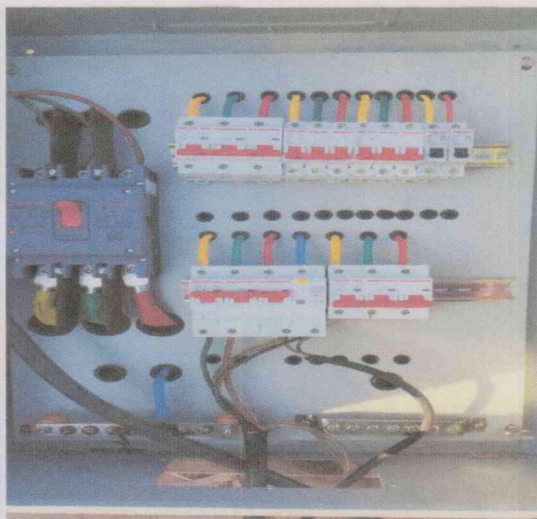


按照“一机 一闸 一漏 一箱”配备电箱




油桶已存放在固定地点并配备灭火器
(现场机械用油都是现用现买, 现场均放置的是空油桶)

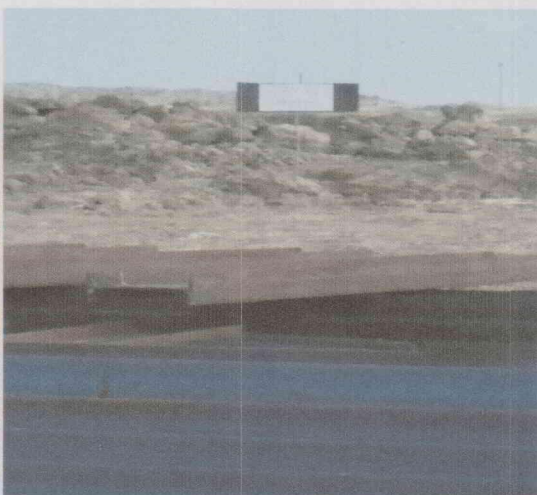

材料进行分类堆码



安全教育资料进行打分

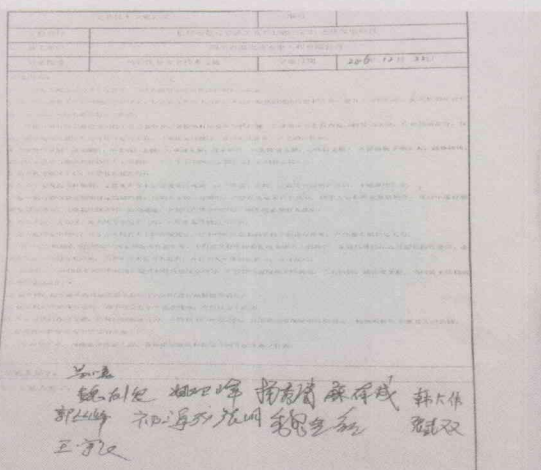

各类安全技术交底
