

# 监理工程师通知单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目

编号：011

致：湖南湘中输变电建设有限公司（董塘项目部）

事由：关于升压站施工质量的问题

内容：事故油池拆模后出现蜂窝麻片问题：



以上问题施工项目部立即整改落实，并对暴露出的问题举一反三防止类似问题再次出现，整改完成后报监理项目部复查。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 王报华

日期： 2017-03-06



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

## 监理通知回复单


工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：011

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 011 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我部已按你监理单位下发的监理通知，对事故油池出现的蜂窝麻片进行整改修复，具体措施，对蜂窝麻片部位，清除灰渣及松动的石子，用大于同等级砝标号的细石砝堵实抹平，自检合格，观感良好。

施工项目部（章）：  
项目经理：  

日期： 2017.03.06

日期： 2017.03.06

监理项目部复查意见：

复检合格

监理项目部（章）：  
总/专业监理工程师：  

日期： 2017.03.06

日期： 2017.03.06

本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

# 监理工程师通知单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：012

致：湖南湘中输变电建设有限公司（董塘项目部）

事由：关于升压站施工质量的问题

内容：配电楼女儿墙拆模后出现蜂窝麻片问题：



以上问题望贵部立即整改落实到位，并查找问题根源及采取的措施报送监理部审核。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日期：2017.03.08



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

## 监理通知回复单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：012

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 012 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我部已按你监理单位下发的监理通知，对配电楼女儿墙出现的蜂窝麻片进行整改修复，并编制了混凝土施工专项方案及相关的技术措施，向工人进行技术交底培训学习，具体资料上报监理部，请予以审批检查。

施工项目部（章）：


项目经理： 

日期： 2017.03.09

监理项目部复查意见：

复检合格

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 

日期： 2017.03.09

本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

# 监理工程师通知单

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目

编号: 013

致: 韶关市关山供电工程有限公司 (董塘项目部)

事由: 线路安全文明施工问题

内容: 你单位施工的 1#塔基础开挖后, 基坑周边无安全防护围栏, 无基坑边坡防护。



以上问题你单位接到通知单立即整改完成, 否则出现的后果由你单位承担。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 

日期: 2017.03.05

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。

## 监理通知回复单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：013

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 013 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我部已按你监理单位下发的监理通知，对塔基周圈进行护栏围护，挂安全警示牌，并对边坡安全支护，经自检达到要求。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2017.03.06

监理项目部复查意见：

复检合格

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017.03.06

本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

# 监理工程师通知单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：014

致：湖南湘中输变电建设有限公司（董塘项目部）

事由：关于升压站施工质量的问题

内容：综合楼室内抹灰，根据国网标准工艺 0101010101 要求，墙体与框架柱、梁交接处挂钢丝网，钢丝网与基体搭接每边应 $\geq 150\text{mm}$ 。贵部施工的内墙抹灰框架柱与墙体无挂钢丝网，梁底所挂钢丝网基体搭接长度不符合要求。

以上问题贵部接到通知单后，立即整改，并报监理部验收合格后再施工。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 

日期： 2017.03.12

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

## 监理通知回复单

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号: 012

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 014 的监理通知后, 已按要求完成了 整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我部已按你监理单位下发的监理通知, 对综合楼墙面挂防裂网进行整改, 达到标准工艺要求, 自检合格, 请予以审批检查。

施工项目部 (章):

项目经理: Junbo

日期: 2017.03.13

监理项目部复查意见:

复检合格

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 姜振宇

日期:

2017.03.13

本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

# 监理工程师通知单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：015

致：韶关市关山供电工程有限公司(董塘项目部)

事由：废旧模板随意堆放

内容：

检查发现在生活区南侧道路旁边任意摆放废旧模板，且存在较多朝天钉，已经影响过路人员安全，不符合现场文明施工要求。



限贵部立即整改

抄送业主方。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日期：2017.3.12



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

### 监理工程师通知回复单

工程名称:董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合示范工程

编号: 015

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZH-JL-015 的监理工程师通知后, 已按要求完成了专项安全检查发现问题的整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

关于生活区南侧道路旁边任意堆放废旧模板已清理出路面



施工项目部 (章)

项目经理

日

期

2017.3.12

施工项目部章

监理单位复查意见:

符合要求。

项目部 (章)

负责人:

日

期:

2017.3.12

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各一份, 施工项目部存一份。

# 监理工程师通知单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：016

致：韶关市关山供电工程有限公司(董塘项目部)

事由：关于一号塔基 C 腿浇筑问题

内容：一号塔基 C 腿垫层超出标高，不符合设计要求，要求马上整改

限贵部在 2 日内进行回复。



抄送业主方。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 孙宇

日期： 2017.3.13

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

## 监理通知回复单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：016

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 016 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我单位已按你监理单位下发的监理通知，对 N1 塔基 C 腿垫层超高部位进行清除，并达到原设计标高。



施工项目部（章）：

项目经理：

*胡均华*

日期：

监理项目部复查意见：

*复检合格*

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

*姜振峰*

日

期：2017.03.14

本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

# 监理工程师通知单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：017

致：湖南湘中输变电建设有限公司(董塘项目部)

事由：质量安全检查情况

内容：


- 1、电缆沟模板存在泥浆未粉刷脱模剂，存在较多垃圾
- 2、加工区场地及进场大路和路旁宣传牌下方请于3月14号上午九点前清洗干净

迎接检查



抄送业主方。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 

日期：2017.3.13



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

### 监理工程师通知回复单

工程名称:董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合示范工程

编号: 017

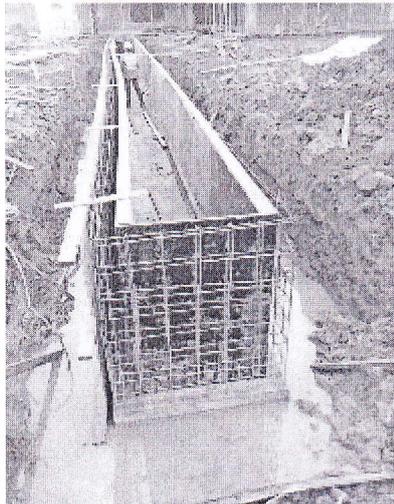
致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZH-JL-017 的监理工程师通知后, 已按要求完成了专项安全检查发现问题的整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、关于质量安全施工。

2 电缆沟模板脱模剂已刷, 上面垃圾已清除。

3 进场大路已清除干净。



常州正衡电力工程监理有限公司  
施工项目部 (章)  
项目经理: *[Signature]*  
日期: 2017.3.14  
董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合示范工程  
施工项目部

监理单位 项目部复查意见:

复检合格

项目部 (章)

负责人: *[Signature]*

日期: 2017.3.15

注 本表一式\_\_\_份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各一份, 施工项目部存\_\_\_份。
