

监理工程师通知单【质量安全】

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

2018.01.14-06
编号：20180126-06

事由：人身安全

签收人及时间：

致：江苏武进建工集团有限公司 驻：前黄项目部


事由：



在工地巡查时发现你单位在施工时，35、36#箱变支模存在严重质量问题，主梁未坐在桩顶上。34#箱变已浇筑、梁坐在桩一半的位置。存在质量问题。要求施工方整改后、通知监理方看后在浇筑。

请在当日内回复

主送单位：武进建工集团

抄送单位：九洲新能源

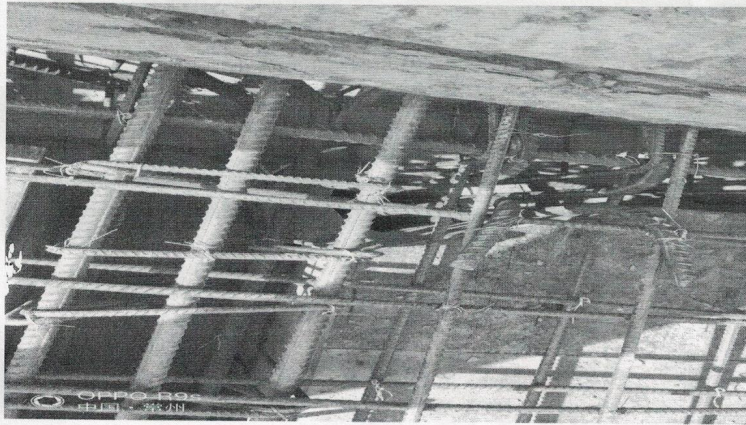

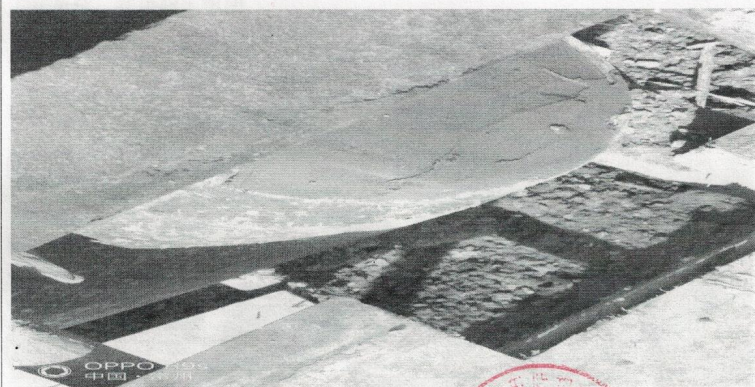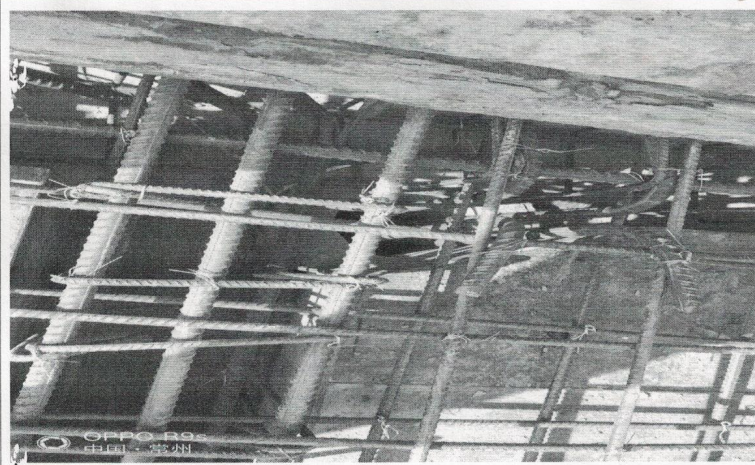

总监 李维军
日期: 2018、01、14

注: 通知单一式三份、业主、总承包、监理各一份。回复单、业主方、监理方各一份
