

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD07

致: 无锡军工智能电气股份有限公司无锡普利司通光伏项目部

事由: 关于连廊间设备基础施工事宜

内容:

2017 年 4 月 27 日星期四我监理项目部在现场专项巡视检查过程中发现设备基础施工未按图施工, 事项如下:

- 1、设备基础植筋位置与图纸不符, 没有打在连廊立柱上;
- 2、连廊之间原有管道位置与项目新建基础位置冲突;
- 3、植筋深度不够, 仅 5~8CM 深;
- 4、连廊承载计算书必须有资质设计院书面确认盖章的文件。

具体详见附件, 如需变更按规定出具设计变更手续, 经同意后方可施工, 擅自施工造成一切后果施工方自负!

抄送: 奥瑟亚(无锡)光伏科技有限公司无锡普利司通光伏项目部


监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 戚子


日期: 2017 年 04 月 27 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份


附图:

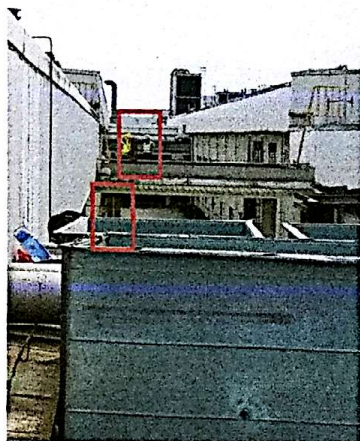

植筋位置偏离

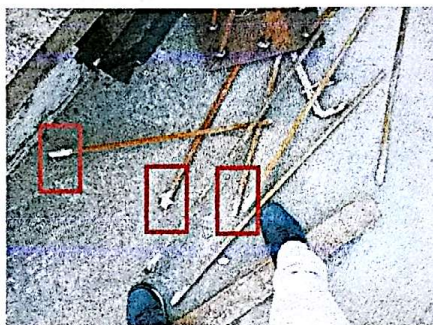

植筋深度太浅

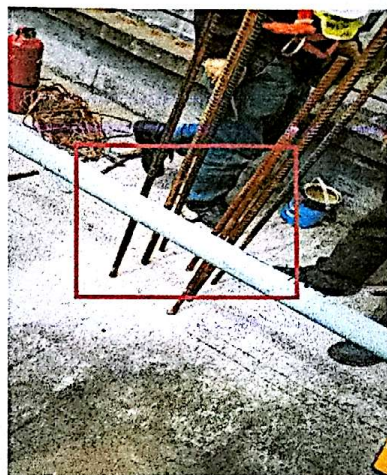

管道与新建柱子位置冲突

--- (以下无正文) ---
