

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD08

致: 无锡军工智能电气股份有限公司无锡普利司通光伏项目部

事由: 关于现场施工相关事宜

内容:

1、2017 年 4 月 30 日我监理项目部在现场专项巡视检查过程中发现二次室设备基础施工未按图施工, 具体如下:

- ①图纸设计要求原有电缆井 C15 回填至标高, 现场未按图纸施工;
- ②若取消静电地板需按要求变更设计, 方案确定完成变更手续后才能继续施工;

2、混凝土预制块搬运过程中没有轻拿轻放, 造成屋面防水层损坏。

3、户外顶管处电缆井未按要求施工, 容易积水, 且积水已经进入顶管。项目采用交联聚乙烯绝缘材料的电力电缆, 长期浸泡在水里, 电缆的绝缘性能降低, 影响电缆使用寿命。

4、项目已接近末期, 并柜停电事宜应尽快立即协商, 以免耽误项目并网!

5、施工资料要与施工进度同步, 及时上报资料。

具体详见附图, 如需变更按规定出具设计变更手续, 经同意后方可施工, 擅自施工造成一切后果施工方自负!

抄送: 奥瑟亚(无锡)光伏科技有限公司无锡普利司通光伏项目部


监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 05 月 01 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附图:

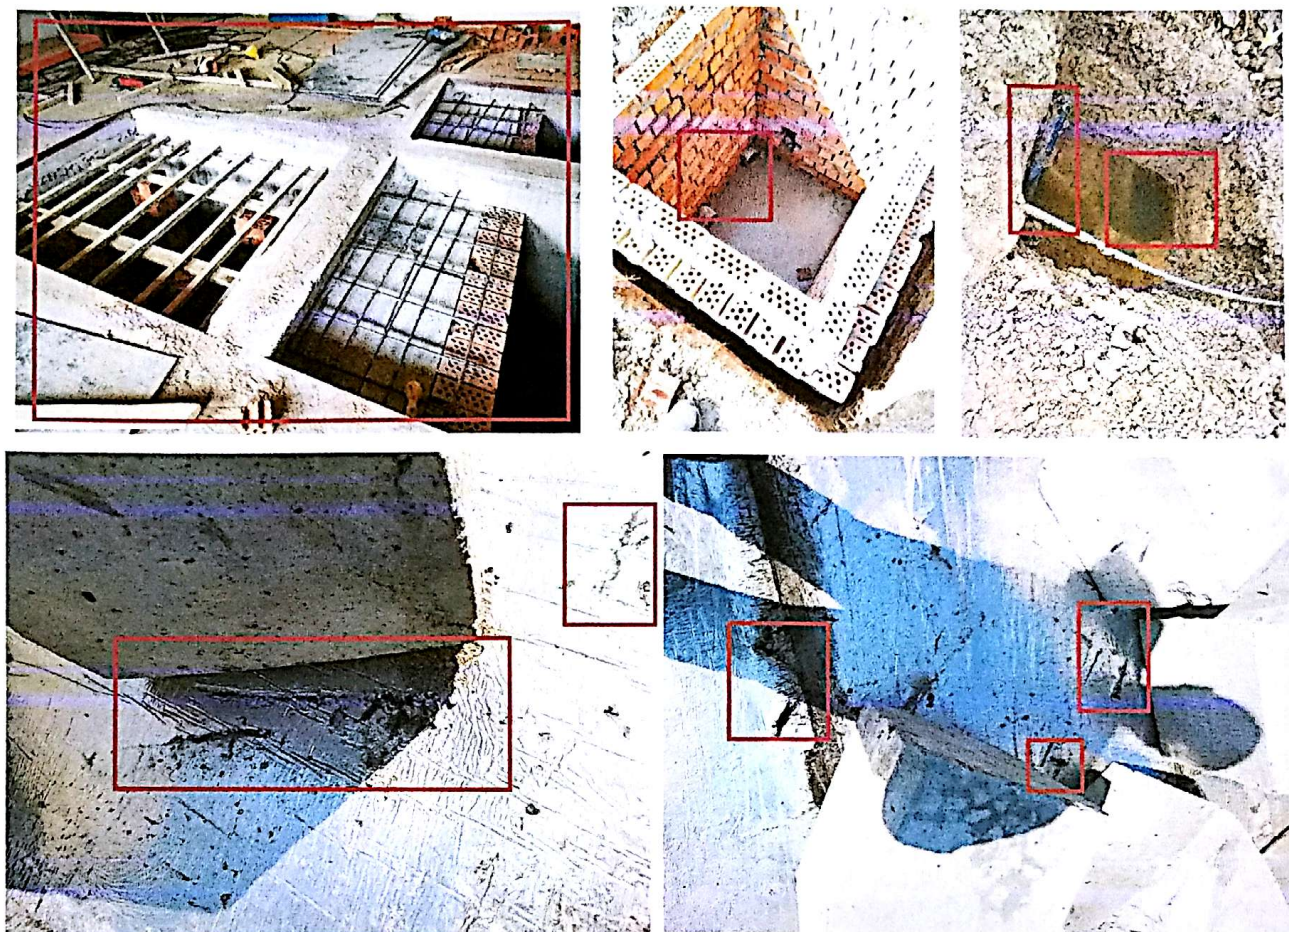

--- (以下无正文) ---
