

监理工程师通知单

工程名称：安丘惠永 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-002

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于现场施工质量问题相关事宜

内容：

经监理现场巡视发现，石埠子新增 4 区、32 区等发现以下一系列问题：

- 1、现场抽检有孔洞深度达不到设计要求（1200mm）；
- 2、部分钻好的孔洞，钻机挪动后，孔洞变形；
- 3、成品孔洞保护措施，需总包方提出可行方案；
- 4、现场施工有一人一机，需两人配合，对孔洞周围碎石、浮土、杂草等进行清理；
- 5、现场桩机必须配备水平尺，确保钻孔质量；
- 6、施工场内有杂草、浮石、梯田等必须场平后才可以进行施工；
- 7、对之前要求整改的孔洞，施工方未实施整改、回复。

后附问题相片

以上事宜限三日内整改后回复


项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：


日

期


注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

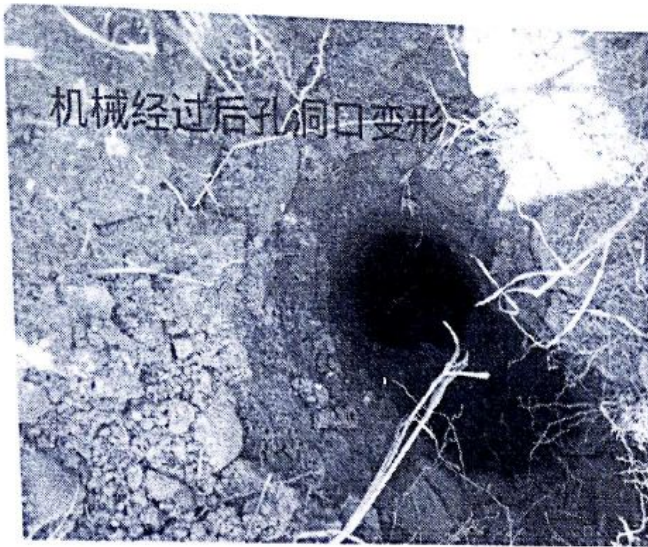


机械经过后孔洞口变形

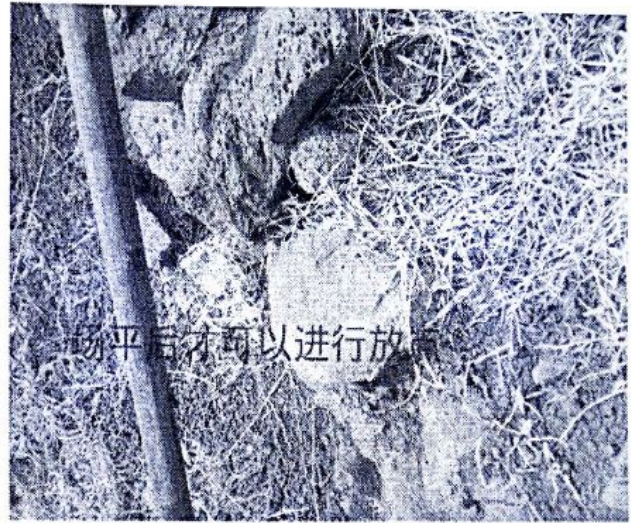

场平后才可以进行放

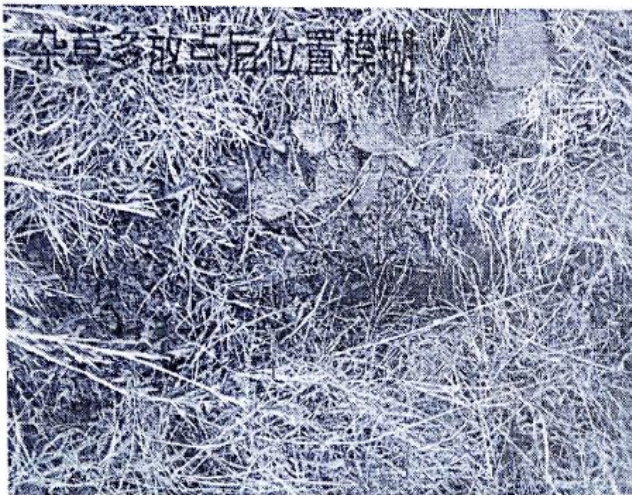


杂草多放点后位置模糊

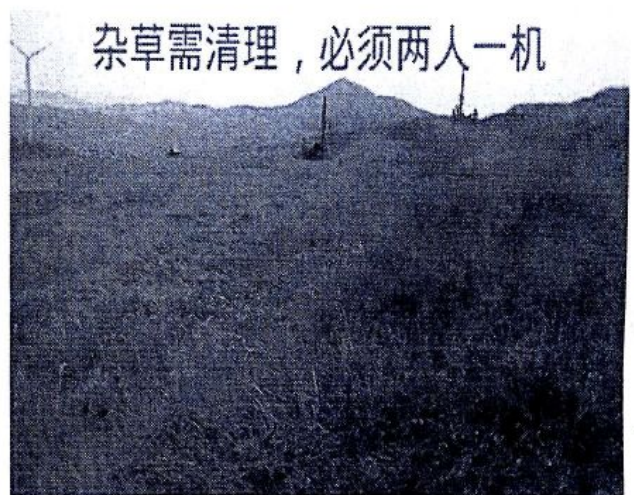

杂草需清理，必须两人一机

新疆维吾尔自治区
水利厅

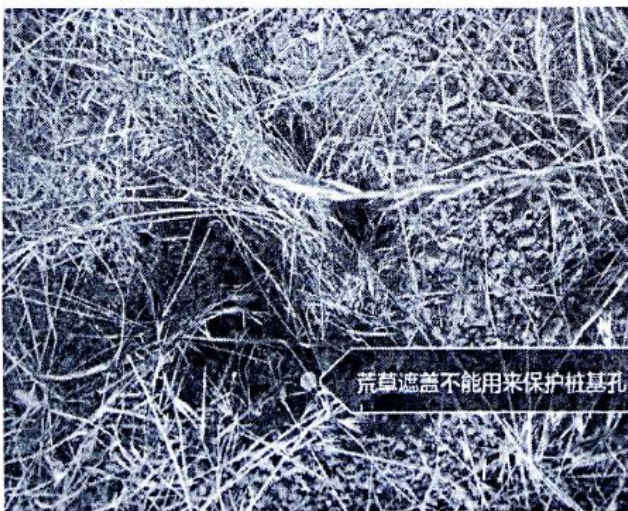

荒草遮盖不能用来保护桩基孔
