

监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-025

致: 中国核工业二三建设有限公司

主题: 关于现场施工质量控制相关事宜

内容:

2017 年 07 月 10 日, 我监理部巡检时发现, 石埠子 4 地锚桩浇筑未严格按照施工程序进行报验, 钢筋 (箍筋) 未按规范要求进行绑扎, 已经浇筑的地锚桩存在偏位、钢筋无保护层及锚桩摇动现象, 现场未做混凝土强度试块 (附页)。

现我监理部要求贵司在 7 月 13 号前整改完成并通知验收, 方可后续施工, 若下次再出现类似情况, 不提前报验就私自进行施工, 将会给予你方 (中核二三) 每次 10000 元处罚, 望你方悉知重视! 并要求你方加强现场管理, 抓好现场施工过程控制, 提前做好每一道工序的报验, 严格按照施工规程规范要求施工, 确保施工现场质量、安全、进度有序进行!


项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师:

日

期: 2017.07.11



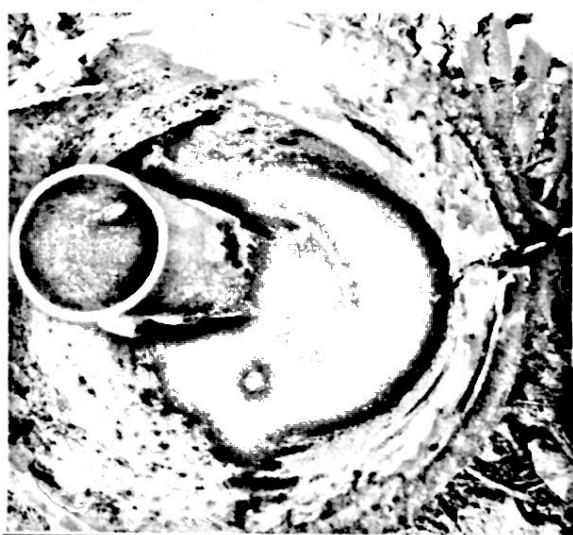

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

