

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-006

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于石埠子 26 地锚桩浇筑质量相关事宜

内容：

按照固定支架桩基控制标准

1、验孔与孔深标准：

根据目前施工图纸，固定支架基础采用 $\phi 150\text{mm}$ 孔径，孔深 $\geq 1200\text{mm}$ 。

2、桩位要求：

桩位精度偏差：轴向偏差 $\leq 15\text{mm}$ ，纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整，同步调整范围 $\leq 150\text{mm}$ 。

3、桩垂直度要求：

每米偏差 $\leq 5\text{mm}$ ，全长 $\leq 10\text{mm}$ 。

4、埋桩要求：

埋桩前周围浮土要清理干净，振捣密实。

石埠子 26 地锚桩浇筑监理人员现场巡检发现部分地锚桩浇筑质量存在问题，已要求施工方限期进行整改。截止 2017.03.20 监理人员再次巡检发现已要求施工方整改的部位，仍还有小部分未整改结束。

现要求施工单位限期 1 天整改结束，再报监理验收合格后再进行施工，否则给予重罚！希望你方引起重视，加强现场管控。

后附不合格相片

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 

日

期：

2017.03.20

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。


图一:



图二:



图三:

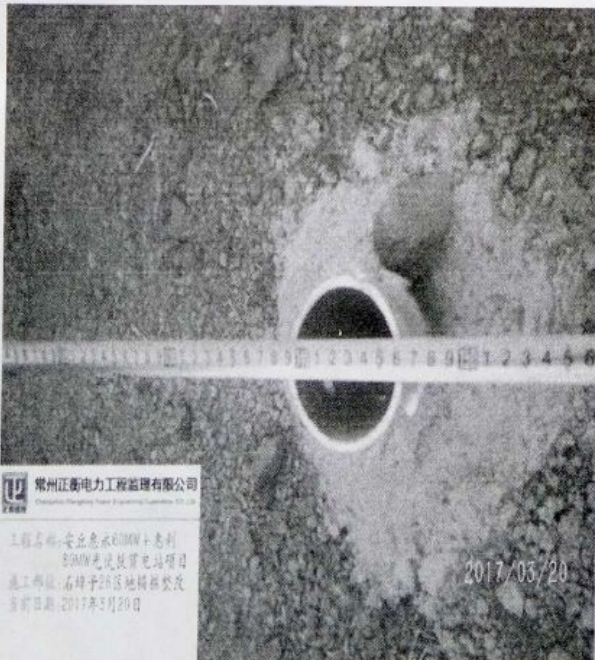

图四:

