

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-009

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于现场施工质量、进度等相关事宜

内容：

经监理巡检发现，总包方二队（李坤坤班组）在地锚桩浇筑过程中存在以下问题：

- 1、桩距控制超出误差范围；
- 2、地锚桩垂直度达不到规范要求；
- 3、东西方向不在一直线（误差大）；
- 4、桩基抹面感观差（未抹平压光）；
- 5、地锚桩外露部分超出误差范围（200~250mm）。

对于上述问题，施工单位即刻停止浇筑，对浇筑不合格的地锚桩进行整改，整改自检合格后报监理整体验收，对于整改后，监理验收仍然不合格，将会对你方进行一定的经济处罚；之后的施工必须确保质量且达到设计与规范要求。

项目监理部（章）：


总 / 专业监理工程师：

日期：




注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。


图一:

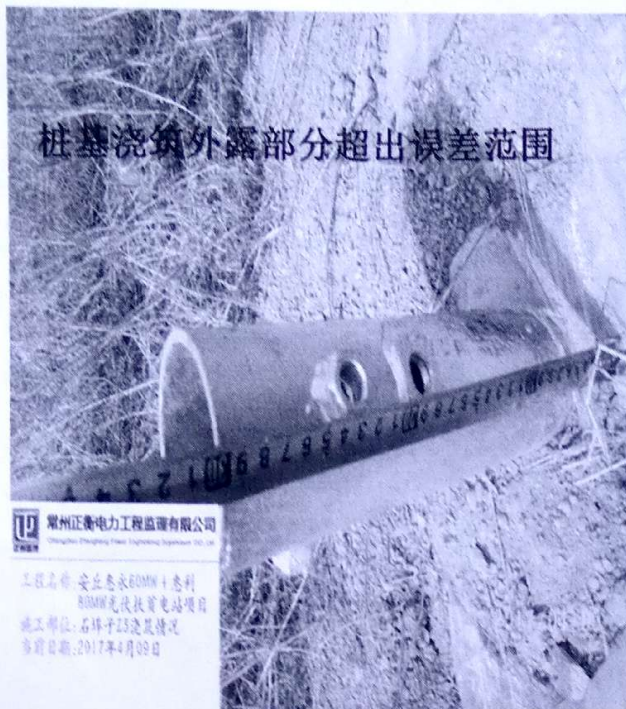

图二:

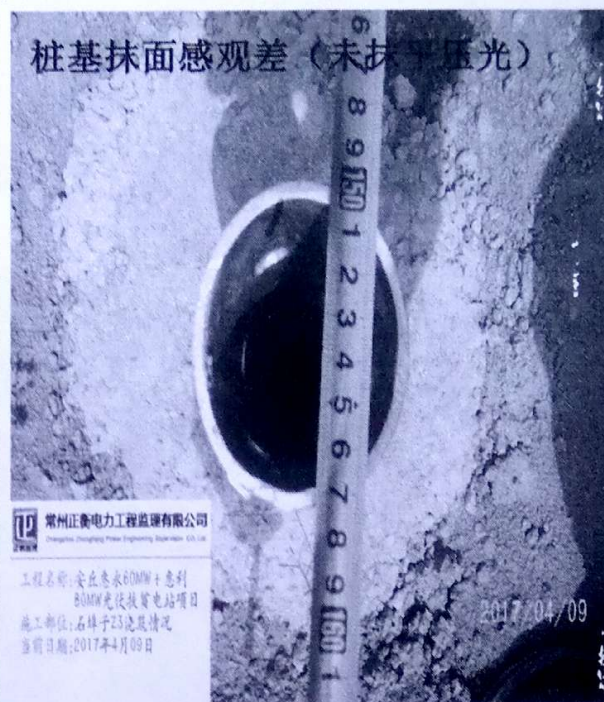

图三:

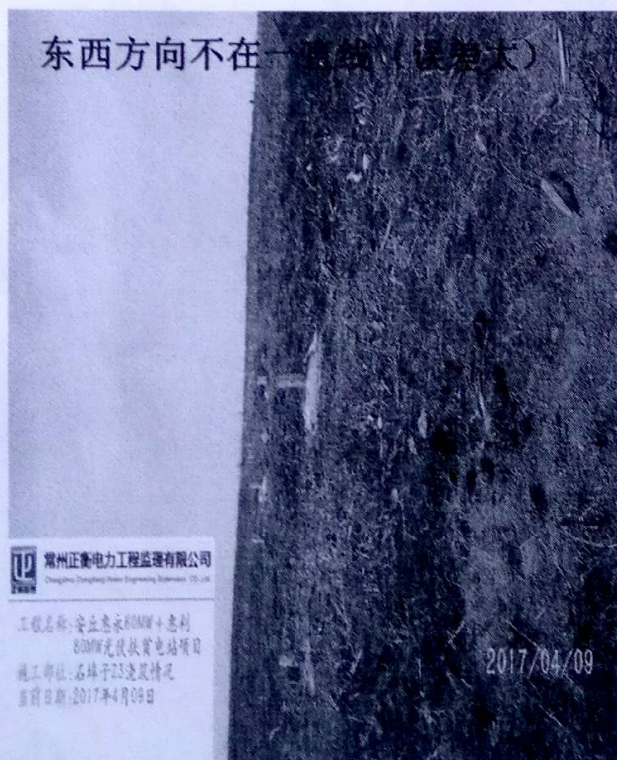

图四:

