

监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-011

致: 中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题: 关于升压站施工质量、安全等相关事宜

内容:

经业主、监理 2017.04.19 在升压站巡检发现:

1、施工单位在搭建满堂脚手架存在安全隐患且达不到《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)安全技术要求;要求施工单位必须立即整改且达到安全技术要求,待监理验收合格后才能进行下一道工序施工,否则严重处罚。

2、施工现场发现利用多次用过的旧模板进行支模,要求施工单位必须清除旧模板上的砂浆,涂抹脱模剂,以免浇筑后拆模有蜂窝麻面出现且影响施工质量。

3、现场第一批进场镀锌扁铁(6*60),经监理现场检查,不符合设计要求(热镀锌,镀锌层不小于 65um),现场实测镀锌层最大不超过 20um,因此要求对该批接地扁铁全部退场,严格按设计要求重新进行采购,进场材料必须报监理进行验收合格后方可使用。

4、对施工现场临时用电必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JHJ46-2005)、塔吊必须严格按照《GB5144-94》(塔式塔吊安全规程)执行。

后附不规范相片:

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。


图一:



图二:



图三:

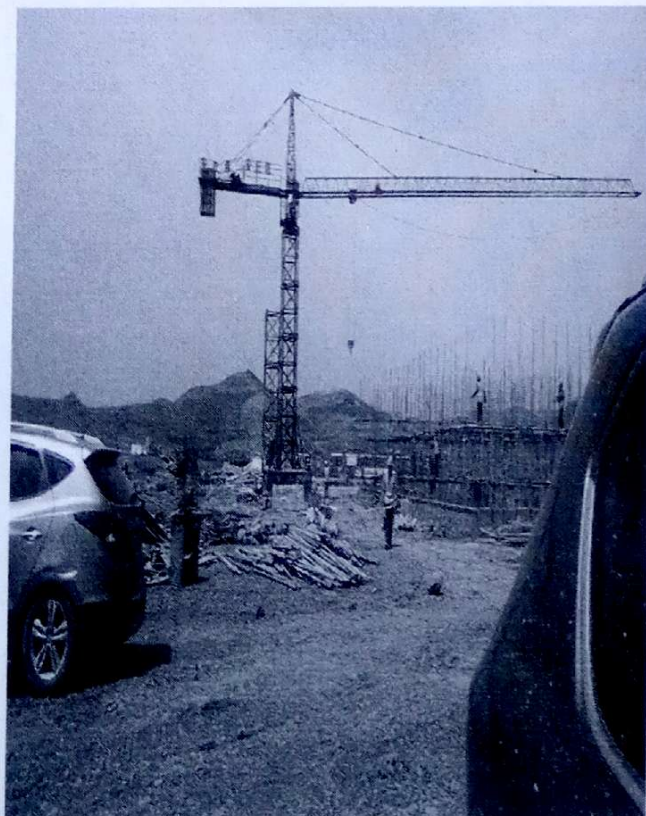

图四:

