

安全监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-012

致: 中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题: 关于安全文明施工事宜

内容:

经业主、监理、总包方 2017.04.20 在升压站施工现场安全检查发现问题:

- 1、现场部分设备没有安全、可靠接地;
- 2、施工现场临时用电线缆随地敷设, 没有架空或地埋;
- 3、部分设备接线不规范 (不用的导线裸露在外, 没有用绝缘胶布缠上);
- 4、施工现场拆除后的木方上有朝天铁钉, 存在安全隐患;
- 5、进场物料摆放不整齐、不规范;
- 6、满堂脚手架扫地杆需调整 (已 > 200mm);
- 7、现场应设安全警示标志: 现场出入、起重机械、高处作业、吊装作业、脚手架出入、检查井口、基坑边、每个临时用电设施等。

对施工现场临时用电必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JHJ46-2005)、塔吊必须严格按照《GB5144-94》(塔式塔吊安全规程) 执行。

安全重于泰山, 要求施工单位加强现场安全管理, 做好现场巡视, 对以上安全隐患及时整改排除, 再报监理复查!

后附不规范相片:

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。

图一:



图二:



图三:




图四:



力工
★
光伏
项目

图五:

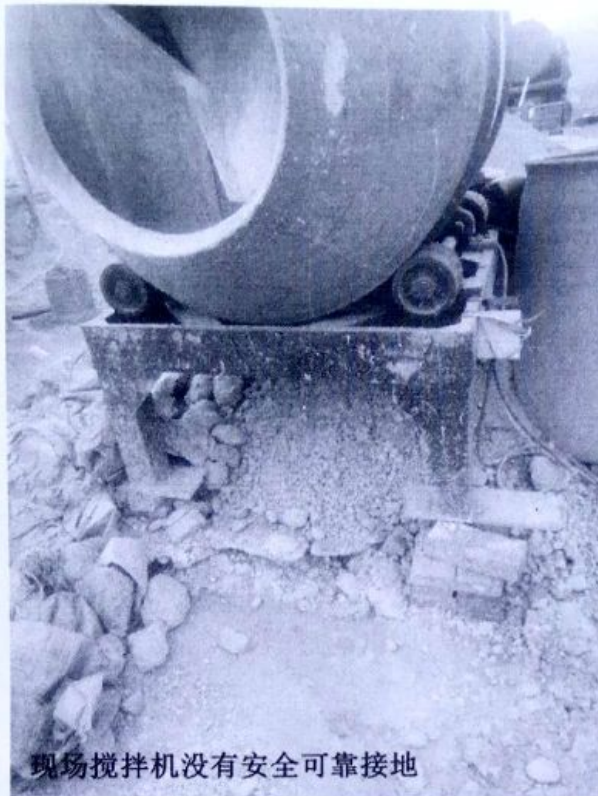

现场搅拌机没有安全可靠接地

图六:




施工现场木方有朝天

图七:



设备接线不规范(没有接的导线裸露在外)

图八:

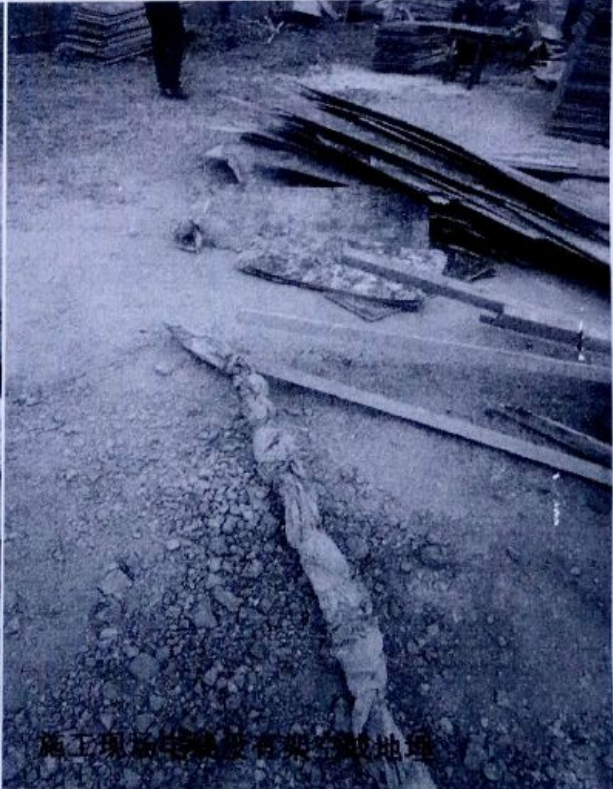

施工现场电箱没有架空或接地

中建五局有限公司
