

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-016

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于升压站施工现场安全问题

内容：

2017.05.09 经监理人员现场巡视发现升压站现场安全存在以下问题：

- 1、你单位现场专职安全员未到场；
- 2、一级配电箱箱体破旧，没有配电箱箱门；
- 3、有两处过路线缆未穿管保护；
- 4、现场用电设备接线混乱，未从三级开关箱接入，且存在破皮露线情况；
- 5、配电室临时爬梯不牢固；

现针对以上问题要求施工队伍立即停止带电作业，安排专职安全员进行安全生产管理工作，并将不符合要求的箱体更换并对过路线缆进行穿管保护，用电设备接线严格按照“一机一闸一保护”的用电规范整改，整改完成报验监理人员复查，整改合格恢复用电施工工作。

以上要求限期 2 日整改完成，如整改再次不合格将给予总包方一定的经济处罚。

后附不规范相片：

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。


图一：一级配电箱箱体破损严重



图二：临时爬梯不牢固



图三：电缆内线裸露

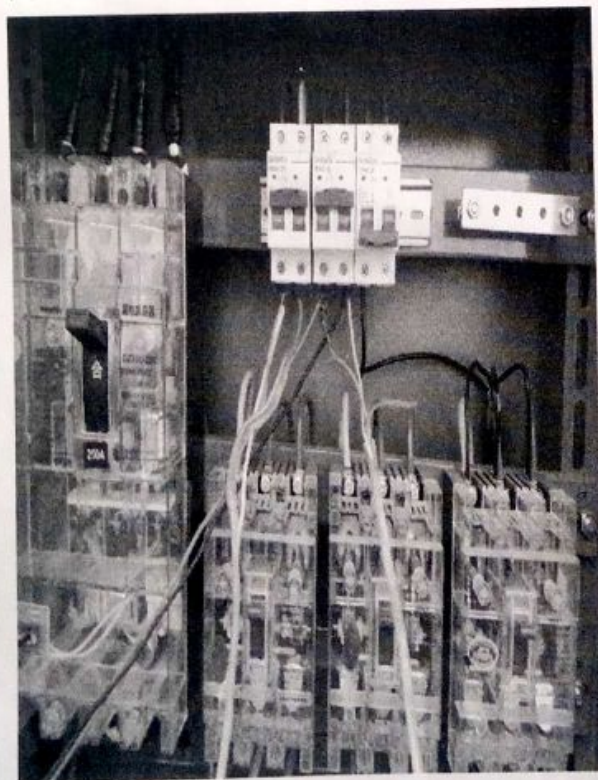

图四：电机未接地



图五：电缆过路未穿管



图六：电缆过路未穿管



图七：电缆过路未穿管



图八：电缆过路未穿管

