

监理工程师通知回复单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：CNI23-GF227-2017-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-003 的监理工程师通知单后，已按要求完成了 关于施工质量、违规及隐患等问题整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、施工作业浮土、浮石、杂草较大石头块均做处理；
- 2、对碎石或惨土调入孔洞满足不了设计要求的重新整改；
- 3、对于 9 区、15 区各个别孔同错位超标整改；
- 4、已完成的孔洞做好防雨水、防杂物调入孔洞措施。

附件：现场整改图片。

业主总包合同未签，项目章暂无

承包单位（章）：

项目经理： 于大生

日期： 2017.03.04

项目监理机构复查意见：

已整改合格。

希望不要再有类似的质量问题出现。抓好现场质量管理。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师： 孙志


日期： 2017.03.05

填报说明：


本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份




打孔不到 1200mm，重新整改

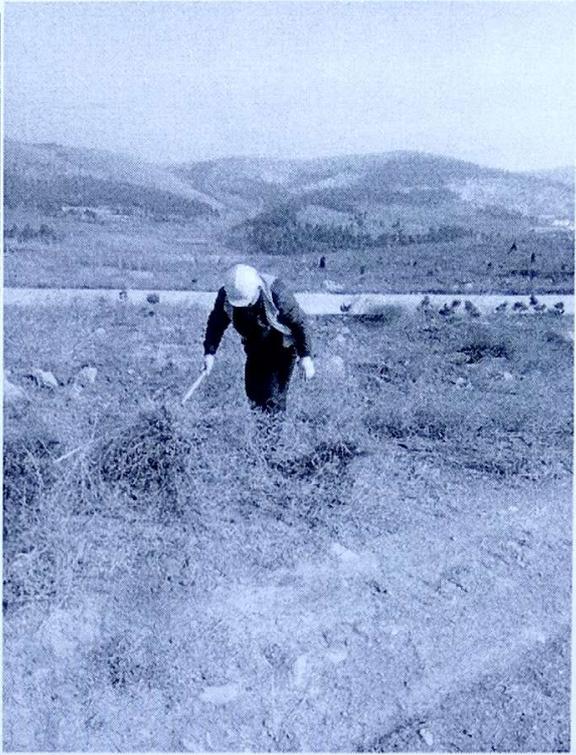

打孔前清楚杂草

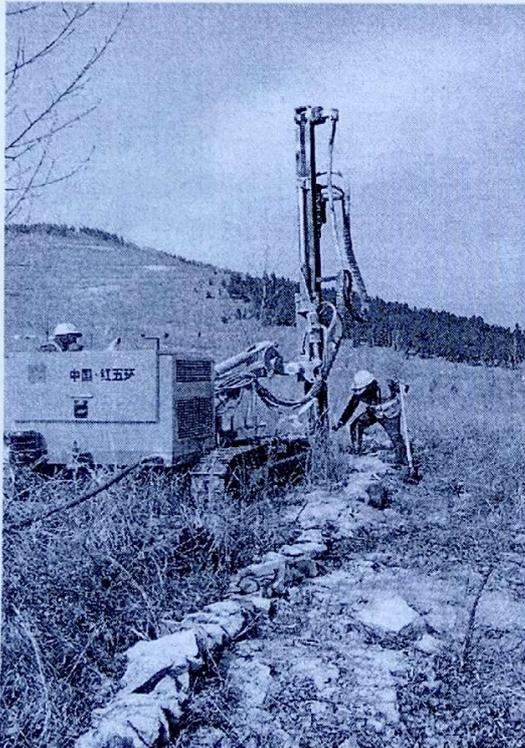

打孔机配备两人施工

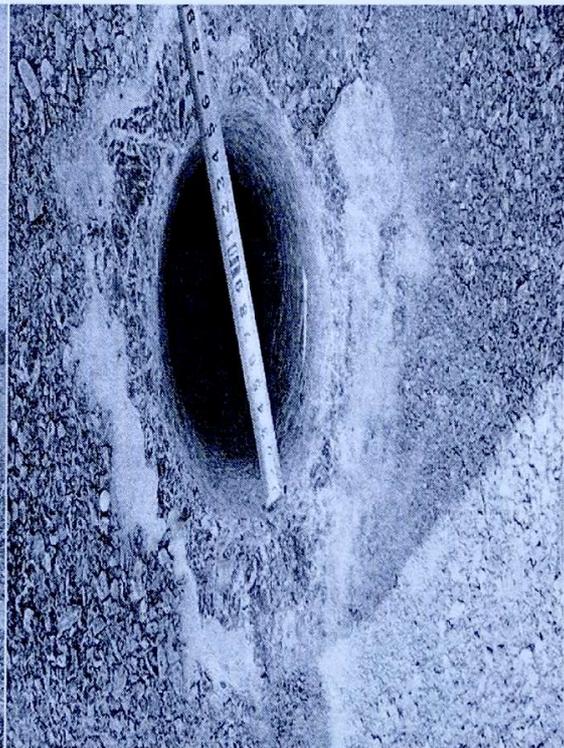

孔洞测量检查，落石清理
