

监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-006

致: 中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

事由: 关于柘山 11 区预埋件浇筑质量事宜

内容:

2017.03.13 经监理、业主巡视检查发现,柘/11 区在预埋件浇筑,存在施工质量问题,不符合规范《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210-2012 及设计要求:


- 1、浇筑后的预埋件部分存在不垂直现象(有倾斜现象);
- 2、桩距超出误差范围;
- 3、浇筑后感观差(混凝土抹面不饱满、未抹平);
- 4、施工现场达不到文明施工要求。

现要求施工单位暂停施工,立即整改、回复,待复验合格后再进行其他区域浇筑!

限 1 个工作日内回复

后附不规范相片

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:  郭浩


日期: 2017.03.13

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。


图一:



图二:

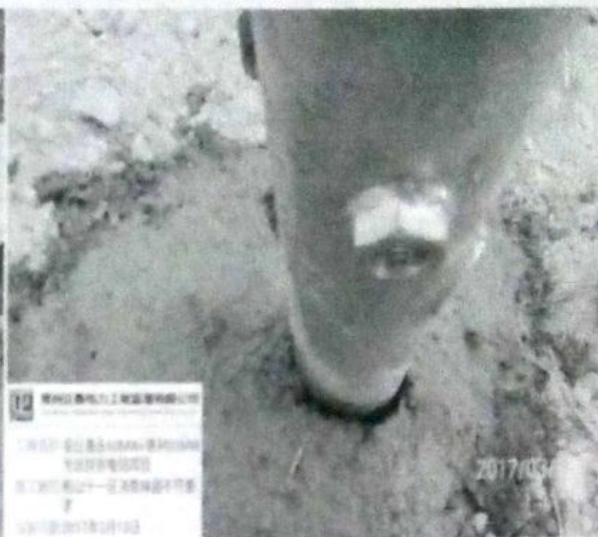

图三:

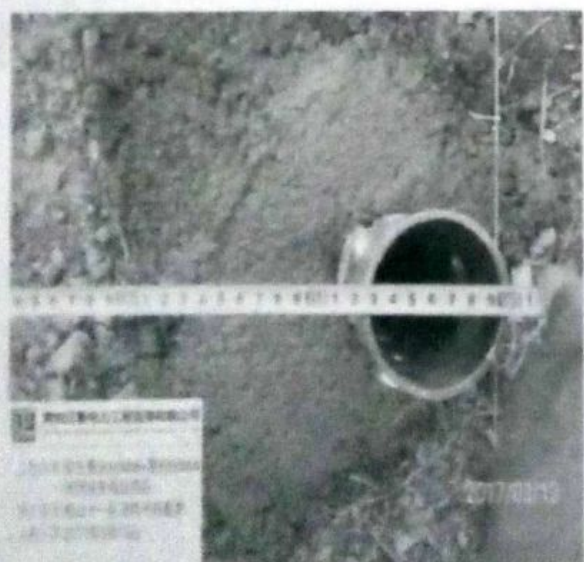

图四:

