

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-037

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于升压站区域水电施工质量的相关事宜:

- 1、升压站给水管道施工结束隐蔽前未做水压试验, 有漏水现象;
- 2、升压站区域排水管道施工结束后未做灌水试验及通球试验, 易造成管线堵塞, 排水不畅;
- 3、电线管的敷设不符合规范要求, 不同材质的线管混用, 管线接口不符合规范要求, 损坏导线, 不利于后期维修;
- 4、动力配电箱未按图施工;

以上问题要求 2017 年 7 月 10 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017.07.06

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。




问题照片



不同材质管混用，管口连接不严密



不同材质管混用，管口连接不严密

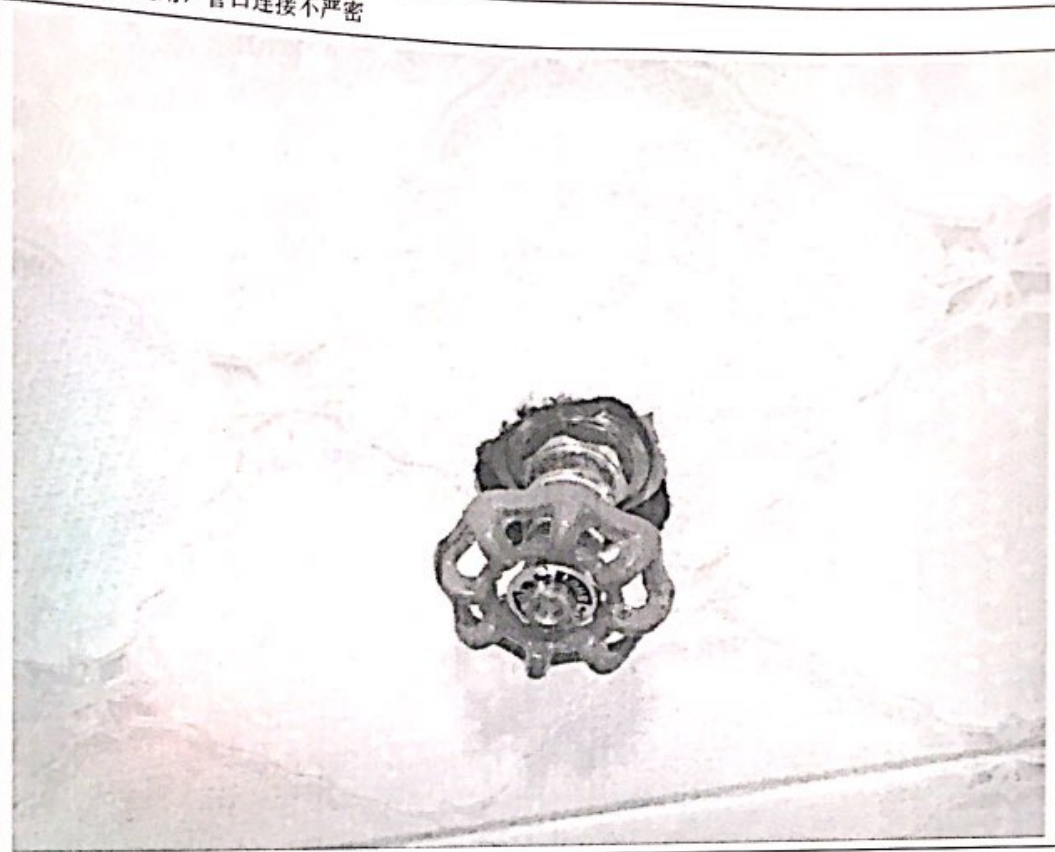


墙内部有漏水声音



水表处漏水

程監
紅星
2020年
互補光伏電
項目部



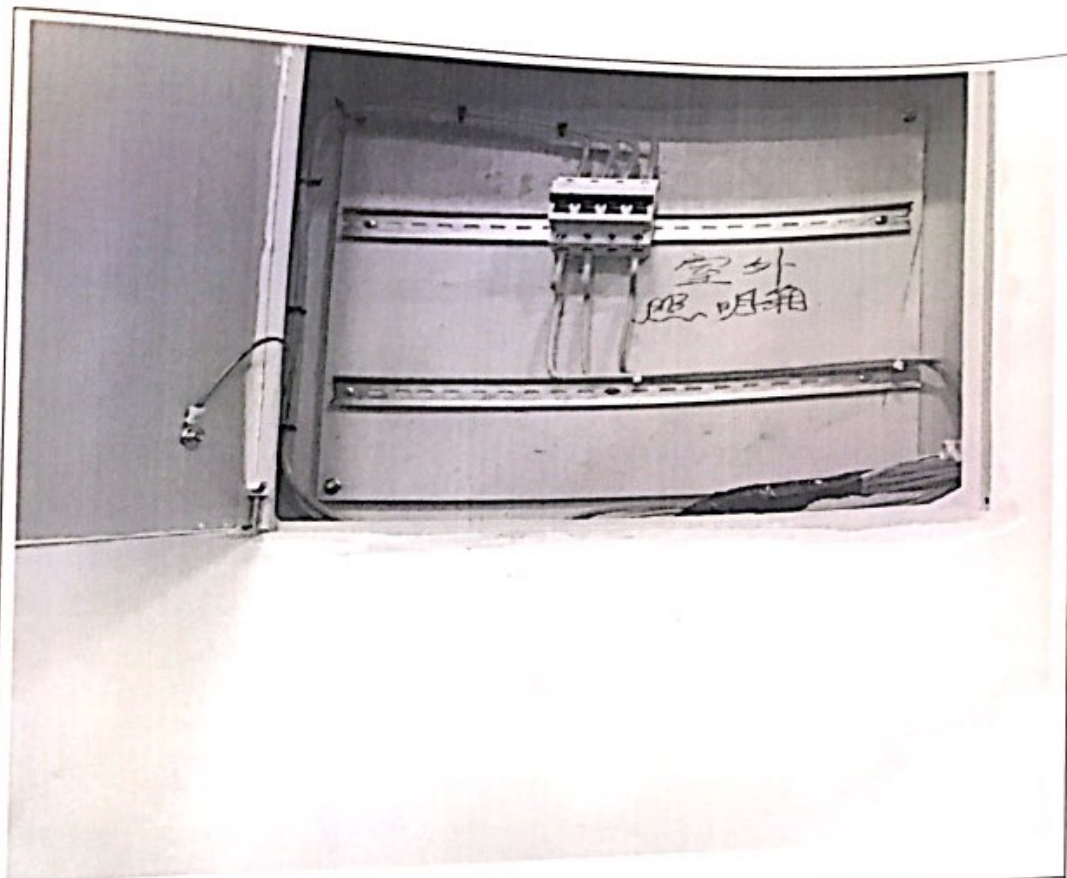

室外配电箱

户外照明箱 ZMH						
照明设备	照明设备					
照明设备						
回路编号	进线	N1	N2	N3	N4	N5
进线相序	A, B, C	A	B	C	A	C
回路容量(kW)	2.54	0.5	1.25	0.18	0.75	-
工作电流(A)	3.31	2.27	5.68	0.82	3.41	-
开关型号	C65N-C-3P	C65N-C-1P	C65N-C-1P	C65N-C-1P	C65N-C-1P	C65N-C-1P
最小断路器额定电流(A)	16A	10	10	10	10	10
导线型号及截面(mm²)	VV22-0.6/1kV-4x10	VV22-0.6/1kV-3x4	VV22-0.6/1kV-3x4	VV22-0.6/1kV-3x4	VV22-0.6/1kV-3x4	-
敷设方式	-	DN25	DN25	DN25	DN25	-
灯罩数量	12	2	5	4	3	-
回路名称	照明进线	主变电室照明	170kV 接地装置区域照明	变电站大门照明	35kV 户外设备区域照明	备用

室外配电箱系统图

