

监 理 通 知 单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-09

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：巡视支架、组件安装的施工情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区正在从事支架安装和组件安装作业，经监理单位巡视，发现支架组件安装存在以下问题需要整改：

1、支架安装局部不符合设计和规范要求，每组上下 22 块的上下边应分别在一线上，现场局部错位严重，影响外观质量；

2、支架安装时有榔头直接敲击支架现象，镀锌层有掉落的风险，直接影响支架使用寿命；

3、组件箱体堆放无防雨措施；

4、组件人工搬运不规范，安装地点堆放不规范，有产生隐裂的隐患；

5、组件安装有翘角、不成线、纵横向缝隙不均、不对线、上下错位等现象。

6、其它方面请你单位自查自纠并整改到位。

以上问题项目监理单位多次在会议上提出，但现场仍然存在此类现象，请总包单位加强施工管理，做一个让业主放心满意的工程。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，现场整改完毕后，请在 48 小时内回复。

（附：现场部分不规范施工照片，共一页。）

2017.04.17

陈富/七


监理单位（章）

总/专业监理工程师：王洪明

日期：2017年04月17日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。

现场部分不规范施工照片：

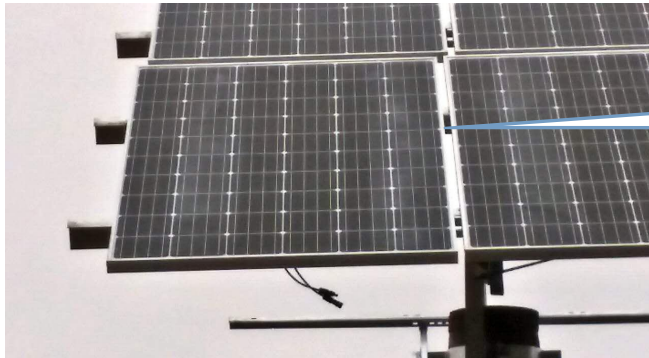

组件上下错缝



安装现场组件乱放



组件边安装不对线



组件箱体无防雨措施
