

监 理 通 知 单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-17

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：巡视现场电气设备安装、水上安装作业的安装情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区正在进行水上的支架组件安装工作和电气设备安装作业，经监理机构巡视发现，现场存在以下问题需要整改：

- 1、水上作业者大多数操作工不佩戴安全设施，脱下挂在架子上；
- 2、正和阳光队安装的工作面部位存在背板划痕现象；
- 3、升压站的主变铁芯接地、夹件接地与本体连接、交接面缺少跳线等，需要及时整改；
- 4、主变接地扁铁存在二面焊接现象，不符合规范要求需要整改；
- 5、柜盘下电缆沟存在积水，需及时烘干，同时尽快做好防水措施，天气预报近期将有雨；
- 6、综合楼暗埋管穿线口没有做护口保护措施，需尽快设置；
- 7、临时用电电箱门没有软连接接地；
- 8、其它方面请你单位自查自纠并整改到位。

以上问题项目监理机构成员已在现场提出整改要求，请总包单位督促并落实整改，整改完成后报监理机构验收，同时加强现场施工的质量、安全管理。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理机构，现场整改完毕后，请在 48 小时内回复。

（附：现场部分不合格施工照片，共/页。）

2017.05.20

张益刚
2017.5.20.




监理项目部(章)
总/专业监理工程师：
日期：2017年05月20日

附不规范施工照片：



接地与本体连接

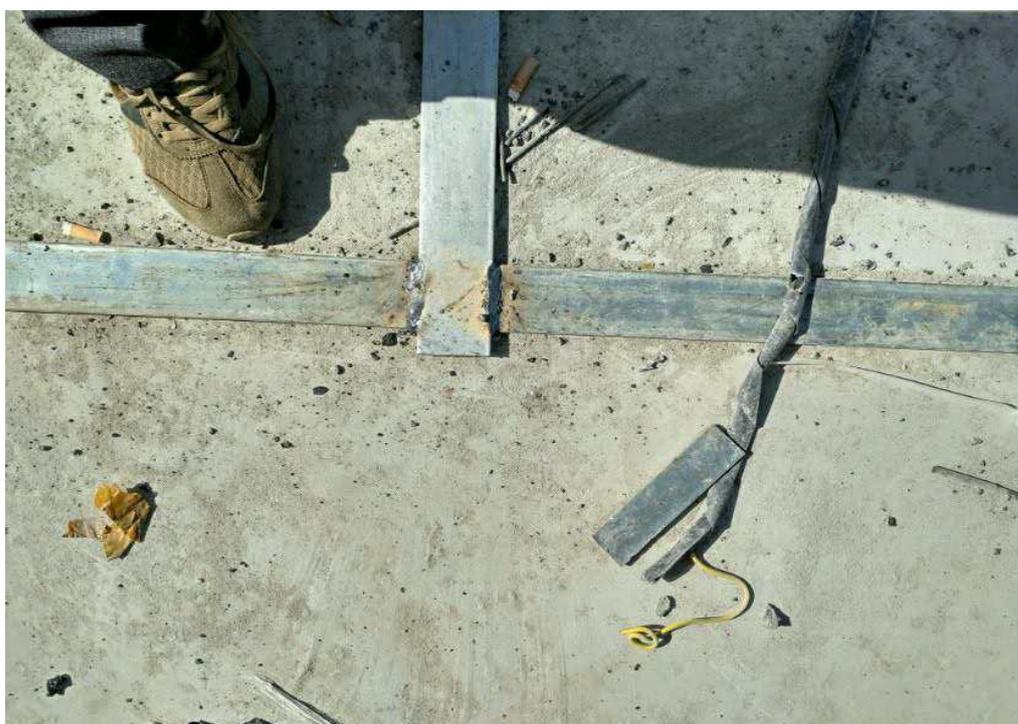

接地扁铁二面焊
