

## 监 理 通 知 单

工程名称：山东思能达能源有限公司新汶工业园 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SND-ZHJL-TZ-013

致：中国电建核电工程公司


事由：关于接地扁铁安装工艺相关事宜

内容：

本项目中接地扁铁安装的要求：扁铁平行于横梁侧面，与横梁接触面超过十公分，打两颗燕尾螺丝铆紧。

现场巡查发现有部分接地扁铁安装时未按工艺安装，出现接触面不足、少打螺丝、扁铁垂直于横梁的情况。

现要求施工队按施工工艺进行施工，将已经安装的接地扁铁进行检查，不按工艺安装的拆除重装，并在两日内提交回复单。

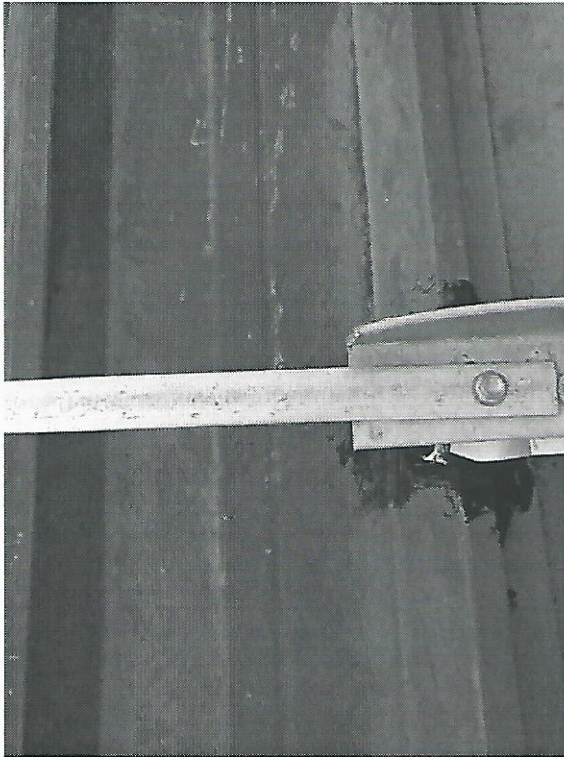

抄送：山东思能达项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：陈松

日期：2017年06月28日

注 本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部两份、施工项目部、监理项目部各存一份。

