

监 理 通 知 单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JITZ-018

致：四川汇安能通科技有限公司

事由：关于你单位施工中存在的质量问题。


内容：8月25日监理在巡检中，发现你单位箱变、逆变之间的电缆敷设已基本完成，在施工过程中存在以下问题：

- 1、1#号塘主桥架电缆敷设未达到施工要求，使得主桥架变形；
- 2、消缺人员配置不到位，使得后期工程无法按时完成；
- 3、机械设备在施工中现场没有看护人员，使得机械设备碰撞以完成的桥架；

上述质量问题发生而你单位不能有效控制，究其原因主要是管理人员数量不足、责任心不强，现场管理工作不到位、三检制度未落实等原因造成。

为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，加强内部质量管理力度，严防此类质量问题再次发生，尽快进行处理；并报我监理部复查，否则一切责任由你单位承担。

(附桥架现状图片)：

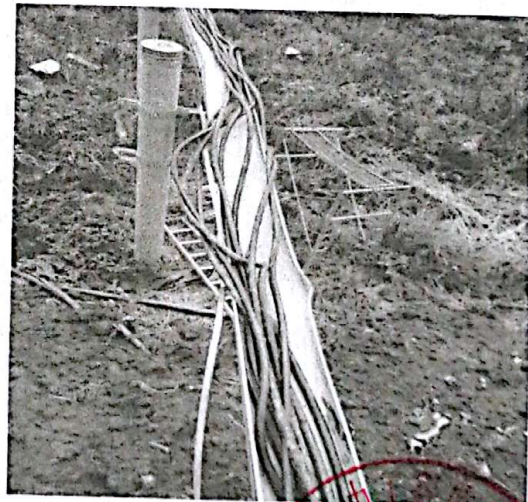

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：陈海

日期：2017年8月25日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存档一份。
