

监 理 通 知 单

工程名称：上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目

编号：ZHJL-SGY-TZ-01

致：上海南电工程安装有限公司

抄送：远景新能（南京）软件技术有限公司、上海台能新能源科技有限公司

事由：现场施工质量、材料不符合设计要求。

内容：根据设计图纸要求你单位前期所施工光伏支架混凝土基础与设计图纸尺寸要求不符，U型地脚螺栓经测量你单位采用为M10型号与设计图要求M12不符。现要求你单位对屋面所有施工已完成的不合格基础进行及时更换，对后续采购相关材料及各工序施工务必严格按照设计图纸进行，不得脱离图纸要求私自进行采购及施工作业。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 03 月 16 日前填报回复单。问题照片见附页共 3 页：

监理项目部（章）

现场负责人： 


日期： 2017 年 03 月 13 日

（备注：待项目章完善再加盖项目章）

注本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



现场实际测量 U 型螺栓为 M10 不符合设计图纸 M12 要求。

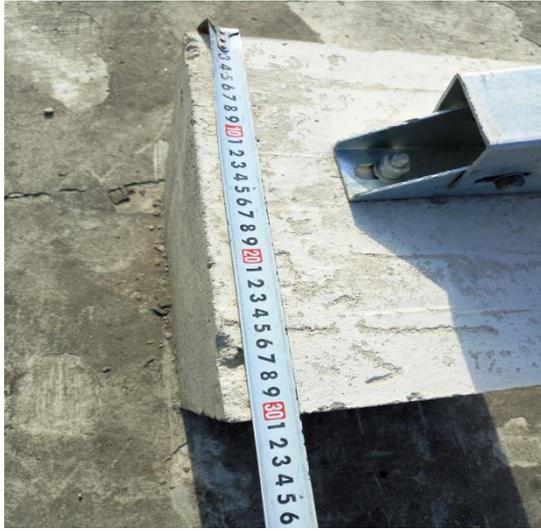

实际测量前立柱基础尺寸为(300*300*280 不符图纸 500*500*300 要求, 单位 mm)



实际测量后立柱基础尺寸为(300*600*280 不符图纸 500*500*300 要求, 单位 mm)
