

监理工程师通知单

表号: B-1

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-008

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 现场施工问题

内容:

- 1、 监理已多次提醒施工单位, 所有隐蔽工程施工必须报验, 但你方在高压电缆放线施工过程中未按规范要求施工, 导致高压电缆外皮划伤, 现要求你方立即安排人员将已放电缆全部进行检查, 并将划伤部位立即进行处理。
- 2、 所有隐蔽工程我方均未收到你方任何报验, 后续出现任何质量问题全部由你方承担。
- 3、 高压电缆头未作保护处理。
- 4、 交直流电缆同沟交叉放置, 埋设深度不符合设计要求, 要求你方立即进行整改。
- 5、 高压电缆放线必须按照规范施工, 电缆沟内石子必须全部清理, 敷设完成之后必须进行铺砂盖砖, 并报监理、业主验收合格后方可进行回填。

后附照片:

限 1 个 工作 日内回复。



项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 赵毅

日期: 2017.8.1

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

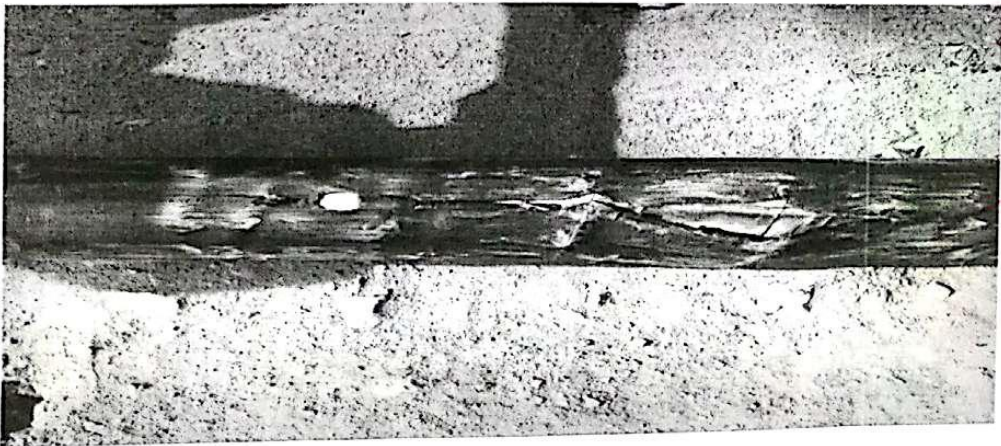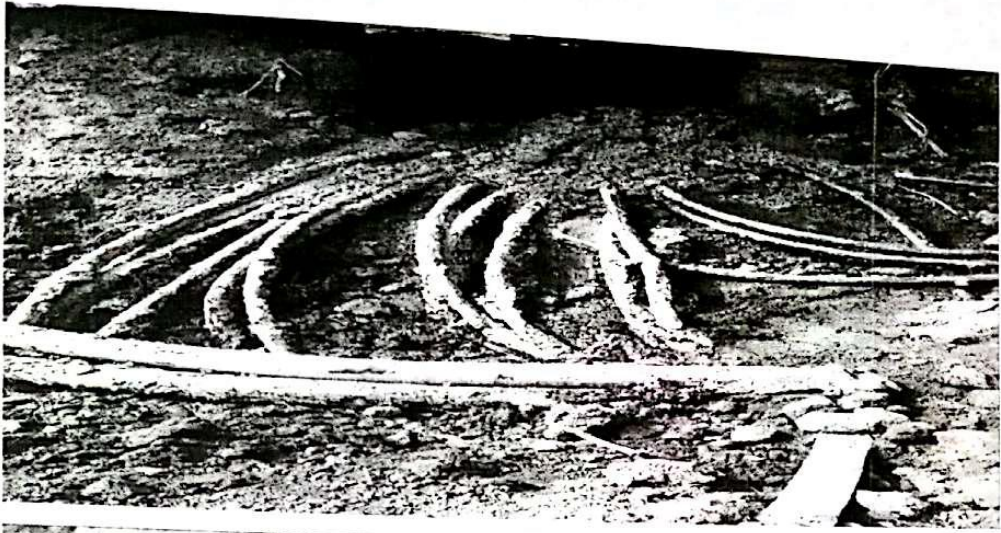

64182-1
