

监理通知单

工程名称：翔宇物流 3MW 屋顶分布式光伏项目部

编号：ZHJL-XYWL-001


致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于施工安全事宜

内容：2017 年 04 月 28 日经监理在现场巡视中发现，发现以下问题：

- 1、组件上面发现有脚印，属于严重违规，严重警告一次。
- 2、起吊设备周围没有警戒线，存在安全隐患。
- 3、采光带没有用安全拖网进行防护。
- 4、组件上放置施工用品，安装过程中用手掌压组件等不规范操作。
- 5、施工期间个别人不戴安全帽。

以上问题现要求你方施工单位立即修改，再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工。

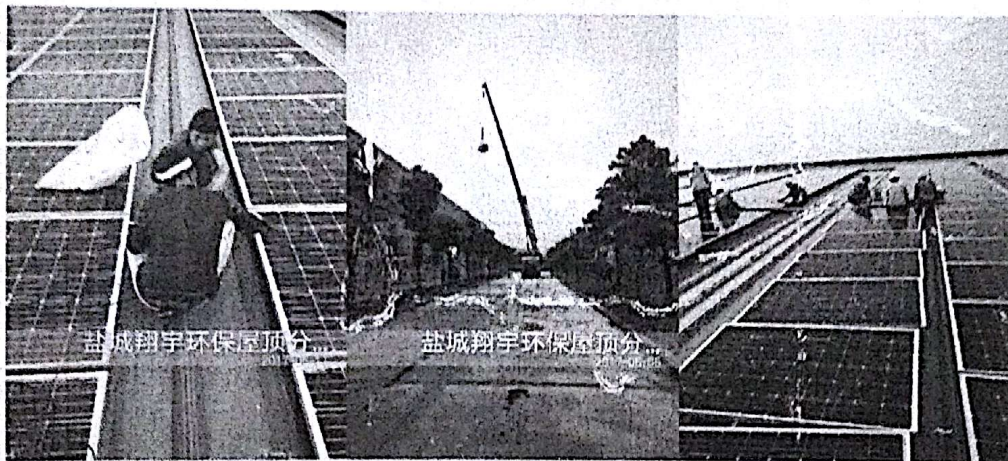

监理项目部

总/专业监理工程师：林玉锋

日期：2017年04月28日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

监理通知单


工程名称：翔宇物流 3MW 屋顶分布式光伏项目部

编号：ZHJL-XYWL-002

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于 3 号屋面采光带损坏事宜


内容：3 号屋面进行组建吊装作业时，因屋顶人员与吊车配合不当，通讯不畅，致使原本预放在木框上的组件滑落至采光带，造成采光带部分损坏，导致出现安全隐患，未造成组件损坏。要求施工单位落实采光带安全拖网防护，修补损坏的采光带，加强安全文明施工，注意施工进度安全有序的推进。

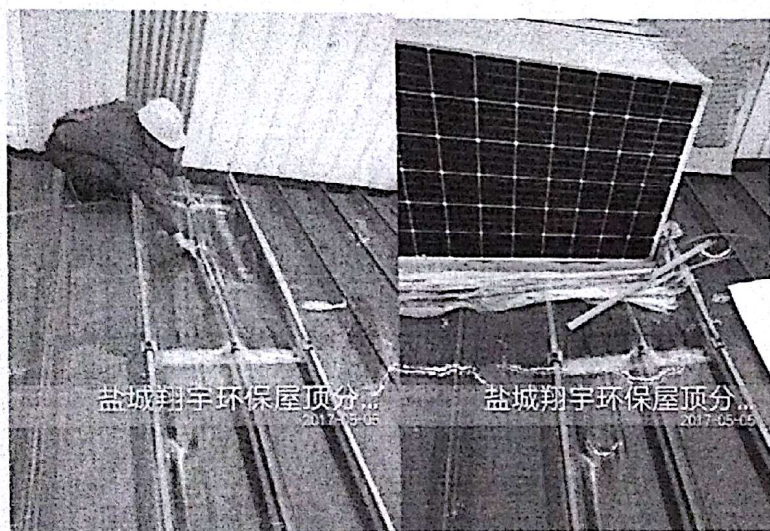

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2017年5月6日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

监理通知单

工程名称：翔宇物流 3MW 屋顶分布式光伏项目部


编号：ZHJL-XYWL-003

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于屋面未组装的零散组件放置事宜

内容：3#屋面组件安装过程中，当天拆箱铺放至导轨的零散组件应当当天完成压块安装，严禁放置第二天再进行安装组件，以免夜晚起风，导致组件被大风掀翻致使组件破损，以致影响施工进度及造成不必要的经济损失，

以上问题现要求你方施工单位立即修改，再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工。

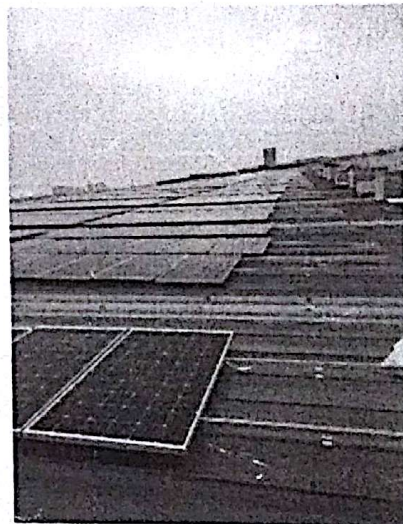

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师： 杨玉峰

日期： 2017 年 5 月 11 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

监理通知单

工程名称：翔宇物流 3MW 屋顶分布式光伏项目部

编号：ZHJL-XYWL-004

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于外线电缆沟开挖施工事宜


内容：由你单位施工的外线电缆敷设，现已完成土方开挖，埋管工作。我单位至今未见正式版施工蓝图，无根据无法对此相工程进行隐蔽验收，如需验收请提供相应的图纸依据。未经验收擅自隐蔽我方对此部位不承认质量合格。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：林亚峰

日期：2017年5月18日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

监理通知单


工程名称：翔宇环保屋面 3MW 分布式光伏发电

编号：ZHJL-XYWL-005

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于外线电缆沟未按图施工事宜。

内容：根据施工方所给的电子版图纸《盐城星启新能源科技公司光伏接入工程》施工设计 GDY-1718-22《排管 1X2 混凝土包封》，排管底部需要 C15 混凝土底板。现施工方未进行底部原土夯实，更未进行底部垫层施工，直接进行排管上部包封。因此造成的一切后果，由施工方自行承担。

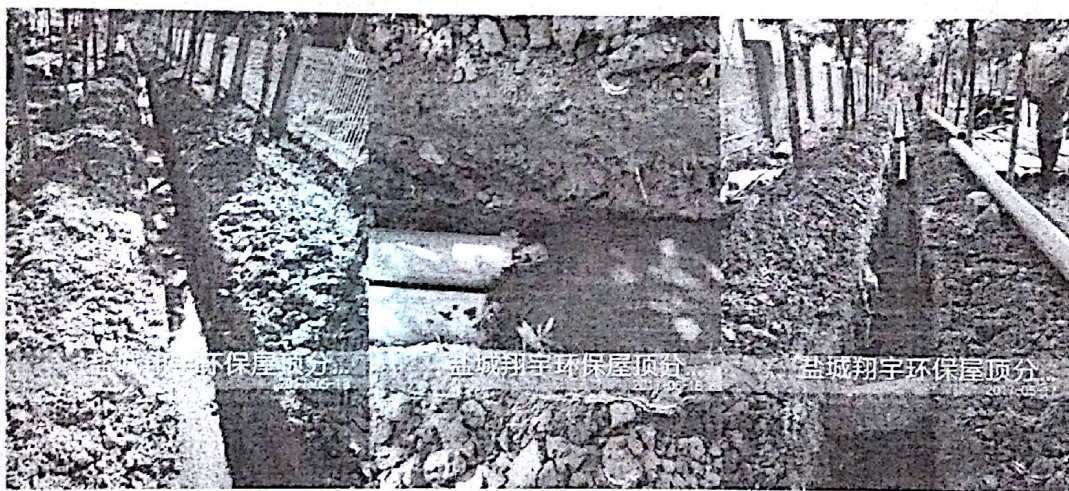

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

监理通知单


工程名称：翔宇物流 3MW 屋顶分布式光伏项目

编号：ZHJL-XYWL-006

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于外线环网柜基础砌筑工作

内容：根据现场施工情况，外线环网柜基础及墙体模板支护工作于 2017 年 5 月 25 日完成，由于至今未收到正式版施工蓝图，要求施工方务必提供图纸并进行平行检查验收合格后方可浇筑，我方于 2017 年 5 月 26 日例行巡检时发现，施工方未经验收已基本完成墙体混凝土浇筑工作，因此所造成的一切后果，由施工方自行承担。

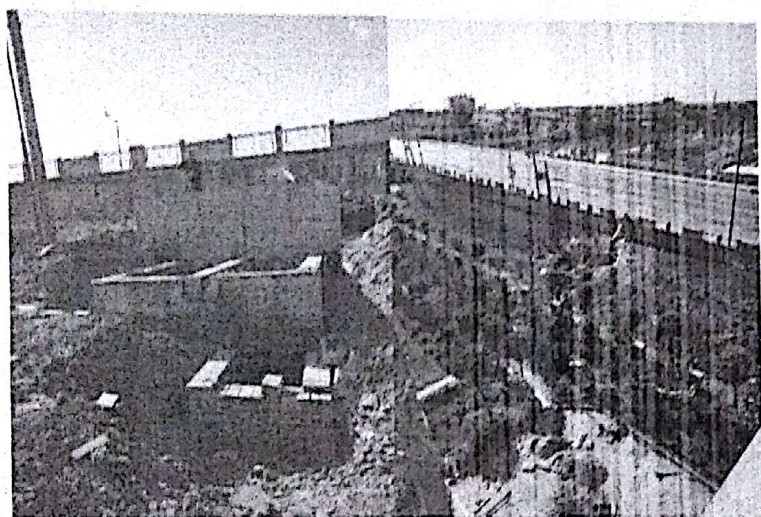

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡玉峰

日期：2017年5月26日

光伏发电项目
监理项目部

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
