

监理通知单

工程名称：翔宇物流 3MW 屋顶分布式光伏项目部


编号：ZHJL-XYWL-003

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于屋面未组装的零散组件放置事宜

内容：3#屋面组件安装过程中，当天拆箱铺放至导轨的零散组件应当当天完成压块安装，严禁放置第二天再进行安装组件，以免夜晚起风，导致组件被大风掀翻致使组件破损，以致影响施工进度及造成不必要的经济损失，

以上问题现要求你方施工单位立即修改，再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工。

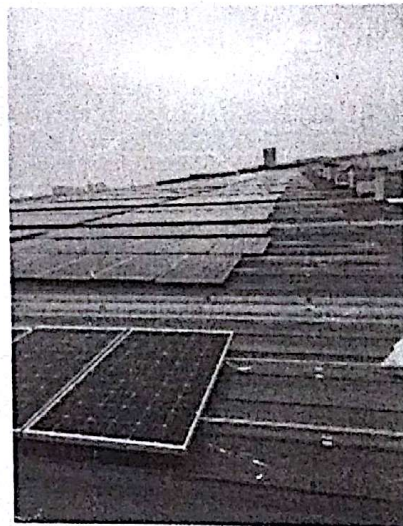

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师： 杨玉峰

日期： 2017 年 5 月 11 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
