

监理通知单


工程名称：翔宇环保屋面 3MW 分布式光伏发电

编号：ZHJL-XYWL-005

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于外线电缆沟未按图施工事宜。

内容：根据施工方所给的电子版图纸《盐城星启新能源科技公司光伏接入工程》施工设计 GDY-1718-22《排管 1X2 混凝土包封》，排管底部需要 C15 混凝土底板。现施工方未进行底部原土夯实，更未进行底部垫层施工，直接进行排管上部包封。因此造成的一切后果，由施工方自行承担。

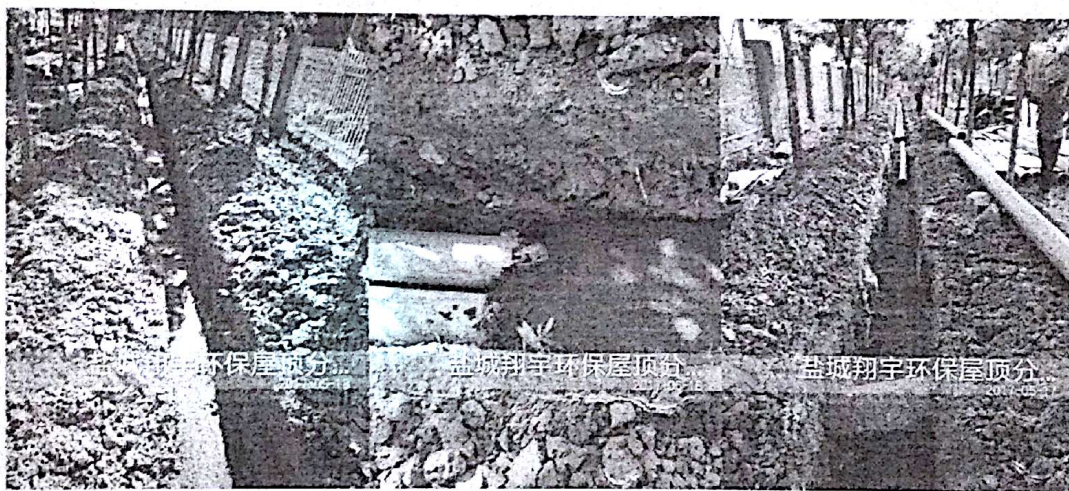

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
