

## 监理通知单


工程名称：翔宇物流 3MW 屋顶分布式光伏项目

编号：ZHJL-XYWL-006

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于外线环网柜基础砌筑工作

内容：根据现场施工情况，外线环网柜基础及墙体模板支护工作于 2017 年 5 月 25 日完成，由于至今未收到正式版施工蓝图，要求施工方务必提供图纸并进行平行检查验收合格后方可浇筑，我方于 2017 年 5 月 26 日例行巡检时发现，施工方未经验收已基本完成墙体混凝土浇筑工作，因此所造成的一切后果，由施工方自行承担。

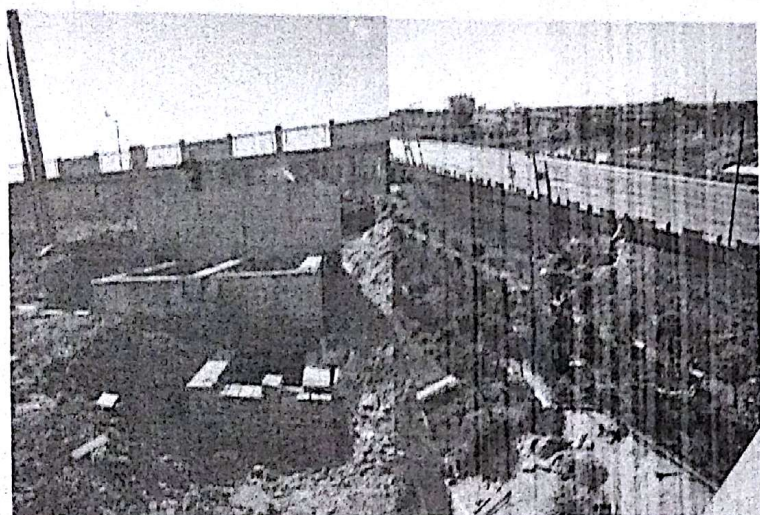

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡玉峰

日期：2017年5月26日

光伏发电项目  
监理项目部

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
