

监理通知单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-005

致 河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目 施工项目部：

事由：关于现场文明安全施工与工程质量。

内容：现场巡视发现以下问题。

- 1、现场桥架安装完成，没有进行固定。
- 2、光伏组件接线完成后，光伏电缆 C4 接头未进行固定。
- 3、光伏组件接线完成后，光伏组件接地未进行制作。
- 4、现场有部分支架连接件螺母下没有垫片。
- 5、2#检修车间与临时脚手架未进行搭接固定。
- 6、1#2#检修车间光伏组件下垃圾未及时清理
- 7、直流电缆外层划破未进行修复。
- 8、汇流箱光伏电缆进出线保护不到位。
- 9、现场施工垃圾未及时清理，堵塞人形道路。
- 10、立面桥架中电缆未进行固定。
- 11、箱逆变进出电缆未进行固定。
- 12、箱逆变接地网焊接处防腐不到位。
- 13、预制仓表层漆面极不均匀。
- 14、进场汇流箱支墩部分有蜂窝，要求施工方禁止使用。

附件：监理通知单问题清单

针对以上问题请贵公司接到通知后及时提交整改方案，限即日内回复方案报监理及业主单位验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：袁野

日期：2017 年 6 月 11 日


本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知单问题清单

主 送	河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部	
工 程 名 称	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目	
建设管理单位	衡水乐阳光伏能源有限公司	业主项目经理：张国锋
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：生金文
设 计 单 位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	设 总：孙琳
施 工 单 位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	施工项目经理：刘永建
检 查 日 期	2017 年 06 月 10 日	
检 查 人	生金文、袁野、张红君	


一、 现场问题：

1、 现场桥架安装完成，没有进行固定。

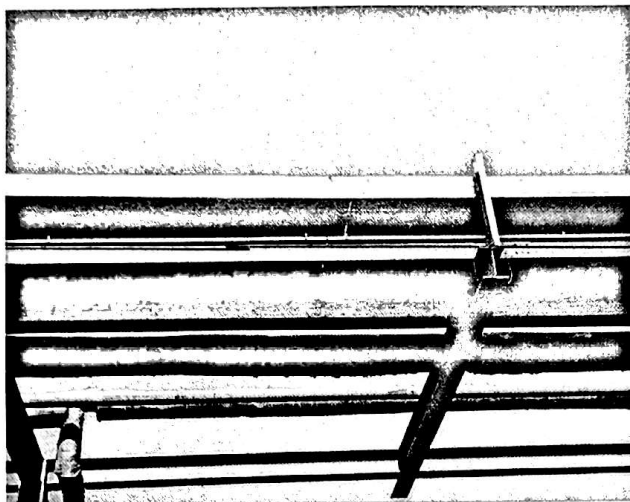

2、 光伏组件接线完成后，光伏电缆 C4 接头未进行固定。


3、 光伏组件接线完成后，光伏组件接地未进行制作安装。

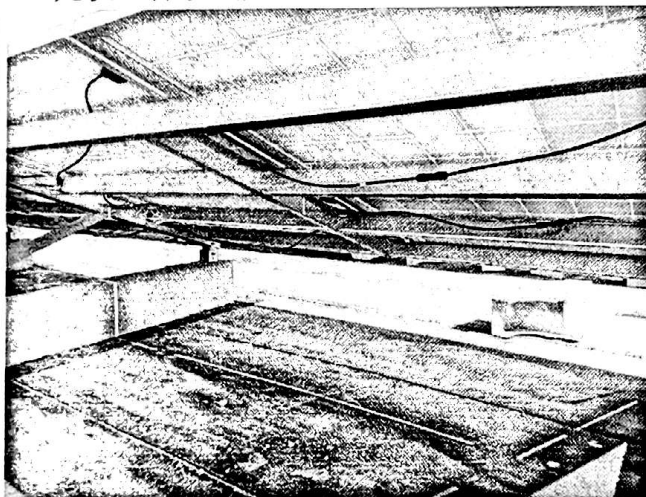


4、 现场有部分支架连接件螺母下没有垫片。



5、2#检修车间与临时脚手架未进行搭接固定。

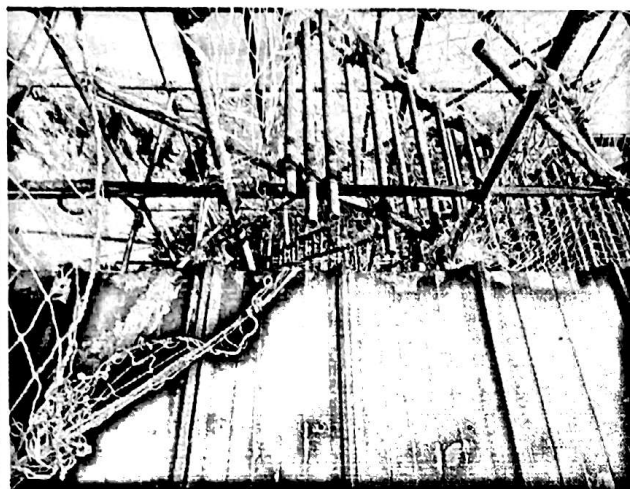


6、1#2#检修车间光伏组件下垃圾未及时清理。

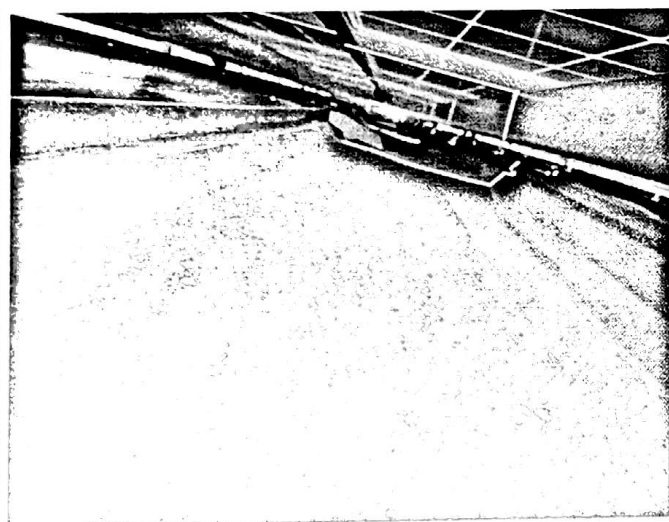


7、直流电缆外层划破未进行修复。




8、汇流箱光伏电缆进出线保护不到位。

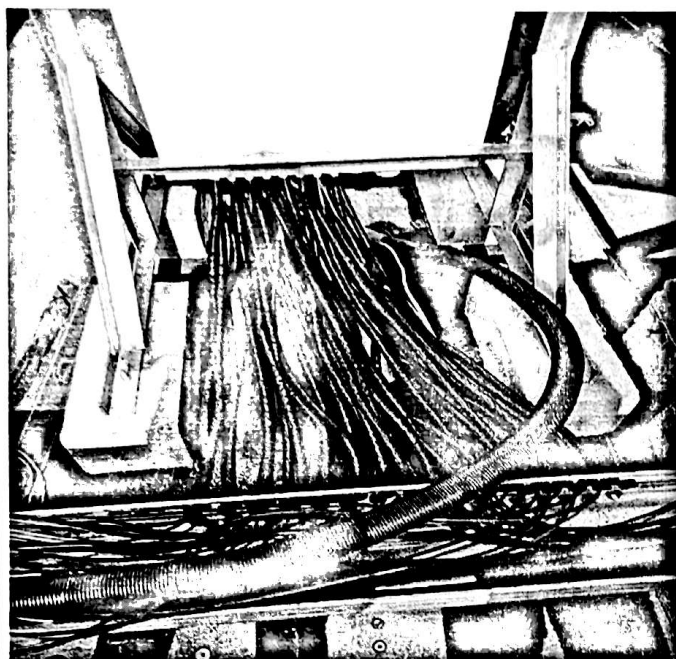


9、现场施工垃圾未及时清理，堵塞人形道路。

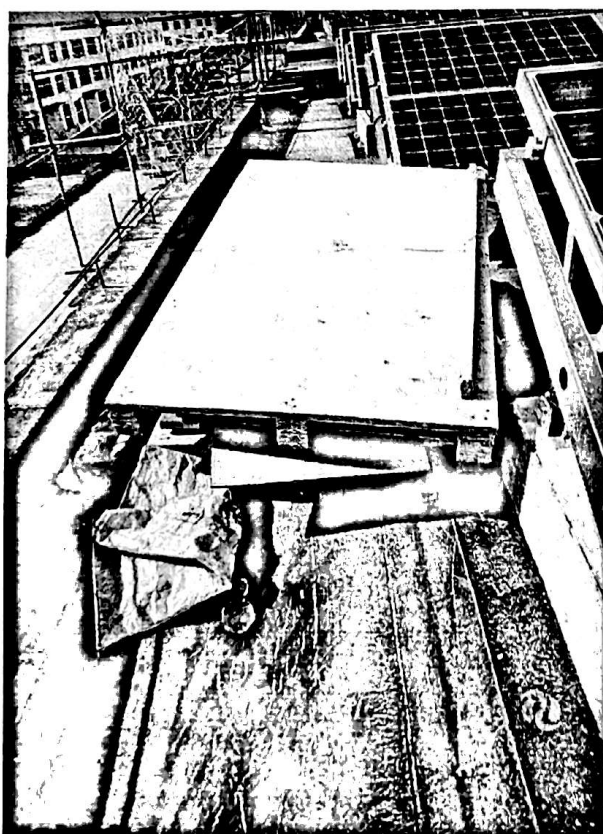


10、 立面桥架中电缆未进行固定。

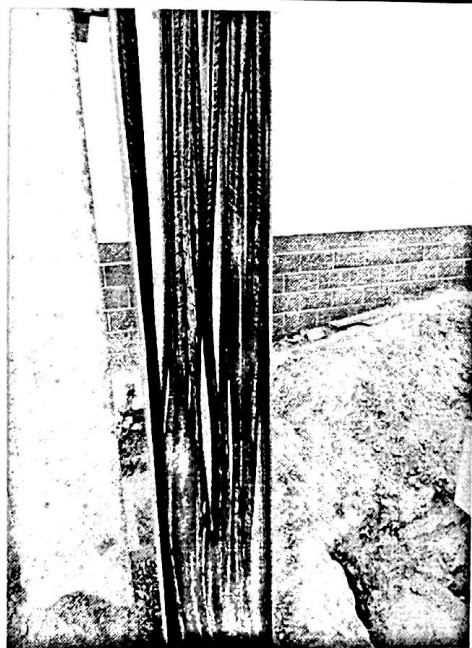


11、 箱逆变进出电缆未进行固定。

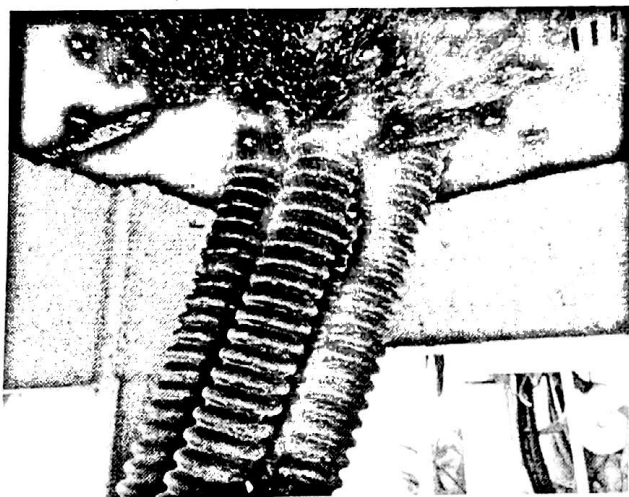


12、 箱逆变接地网焊接处防腐不到位。

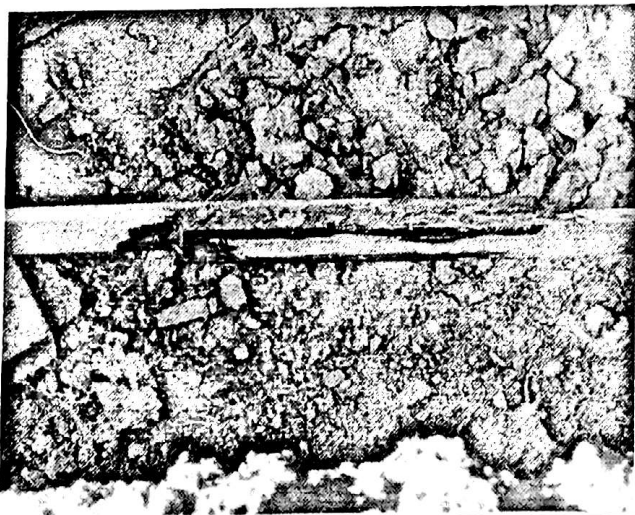

13、 预制仓表层漆面极不均匀。



14、 进场汇流箱支墩部分有蜂窝，要求施工方禁止使用。

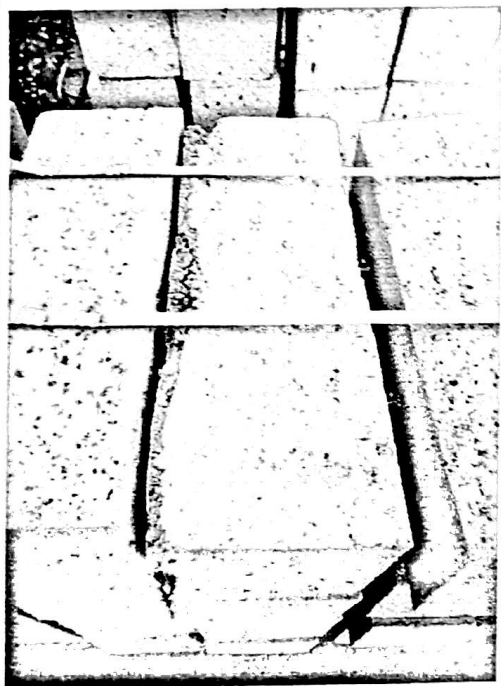

**针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，限 1 日回复整改方案报由
监理及业主单位验收。**

河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目监理项目部

2017 年 06 月 11 日
