

监理通知单

工程名称:山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号: SDSY-ZHJL-004

致: 大连秦能电力工程设计有限公司神宇机械制造 6MW 施工项目部

事由: 关于施工现场安全、质量事宜

内容: 现场发现如下需要整改的问题

1、组件至逆变器光伏线缆穿保护管多根线缆进同一保护管与规范不符，组串间外漏电缆连接处不能用白色 PVC 管连接。(要求一根电缆配一根保护管)。

2、箱变接地极长度不足，与水平接地体扁钢焊接长度不够，未按图纸要求四周布控形成接地网，只在一侧布置。


3、箱变基础钢筋绑扎箍筋间距过大，与设计要求不符。

3、彩钢屋顶采光带未有安全防护措施及安全警示标示。

4、组件安装过程中组件上摆放杂物。

以上问题由施工项目部接到通知后立即整改，整改完成后报监理项目部复查。



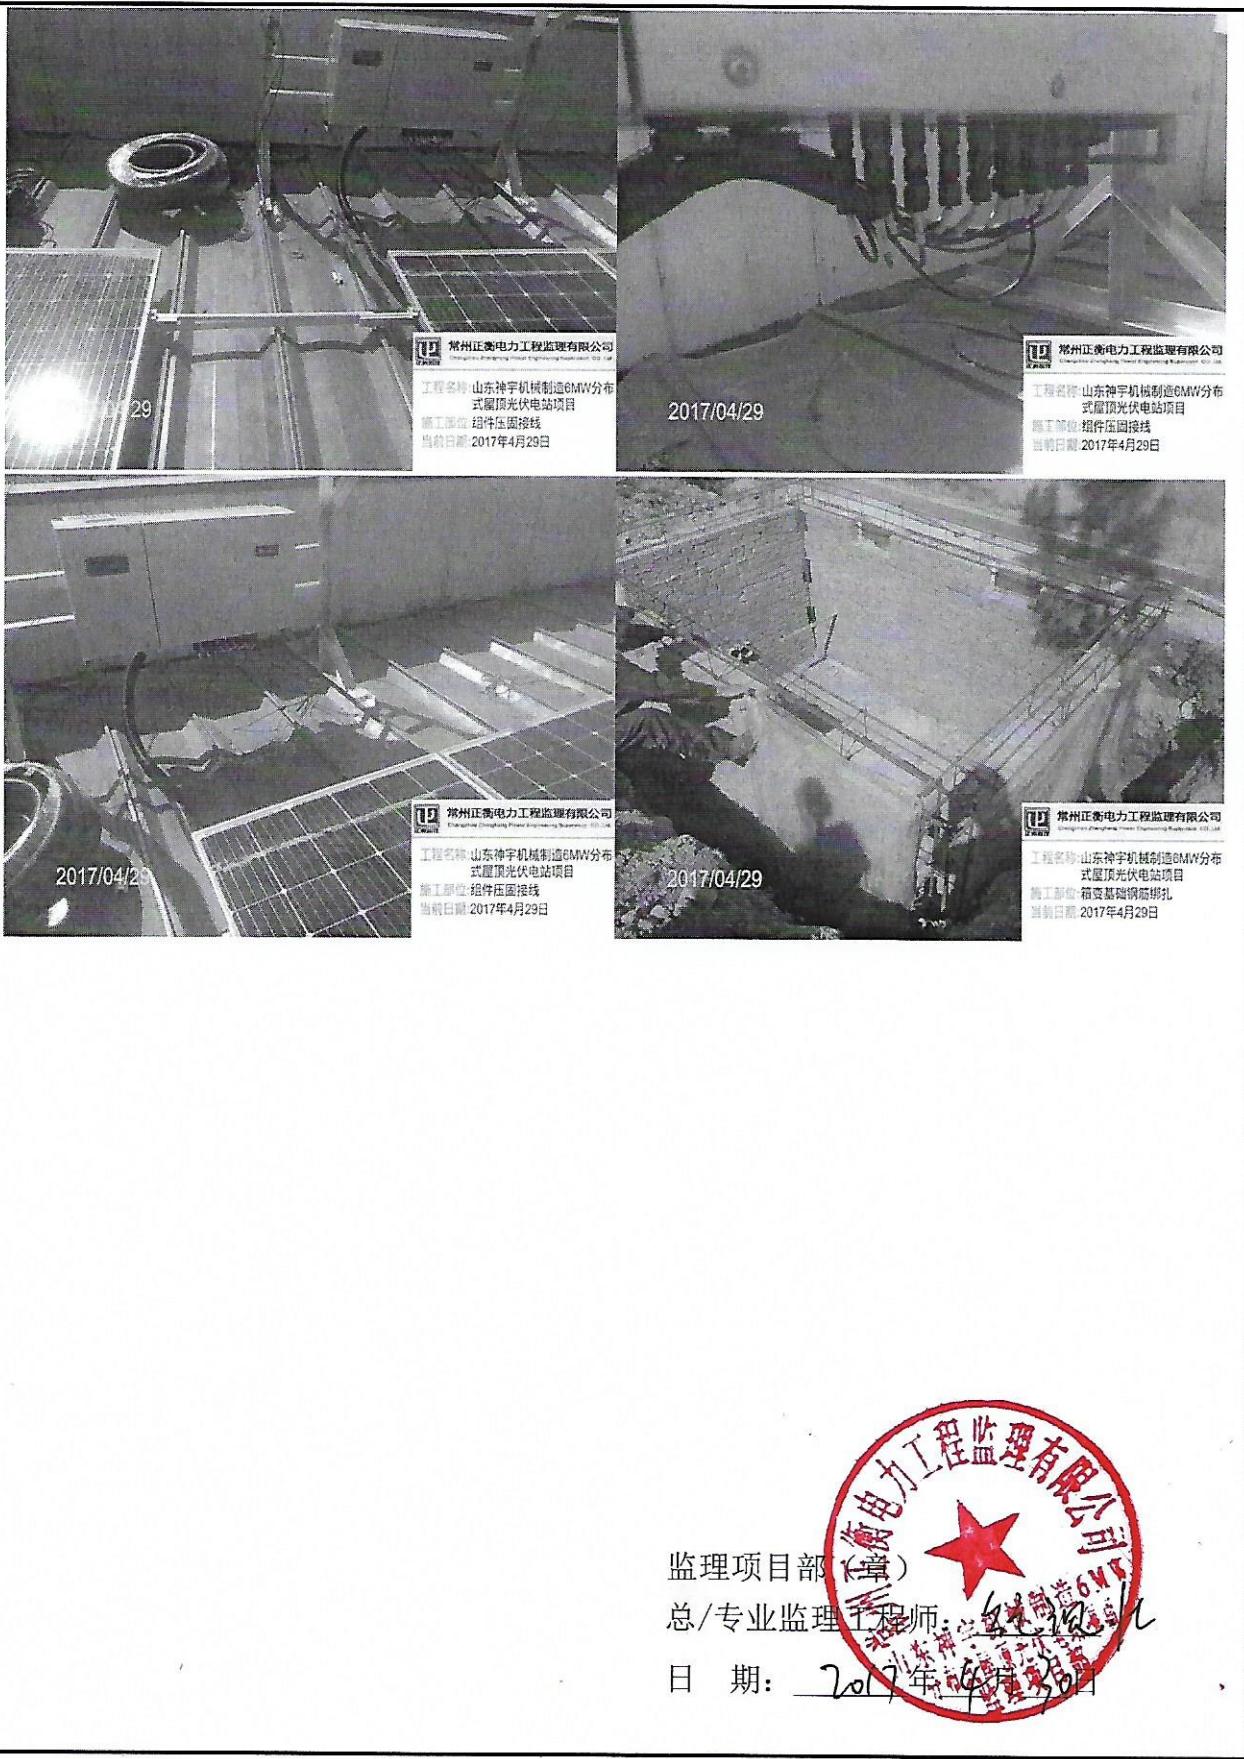

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份

